

获嘉县公共检验检测中心能力提升建设 项目绩效评价报告

主管部门：获嘉县公共检验检测中心

委托单位：获嘉县财政局

评价机构：河南云域网络科技有限公司

评价时间：2024年9月



摘要

为贯彻落实《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）、《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对获嘉县公共检验检测中心负责实施的“公共检验检测中心能力提升建设项目”开展绩效评价，形成此报告。

获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目主要建设内容为：新购置食品、农产品检测类设备43类（45台/套），精细化工检测类设备7类（7台/套），计量器具校准类设备3类（包含通风机能效检测装置1套、可燃有毒有害气体报警器检定装置1套、车检机构校准装置1套），以及实验室室内改造工程（改造面积1,092 m²）。该项目于2023年3月初设备购置均已调试安装并验收完毕，并于2024年2月完成项目审计工作。

本项目2022年申请发行专项债券资金1,800.00万元，审计结算总价为1,756.644976万元，实际支出1,753.563794万元，预算执行率为99.82%，专项债券资金结余46.436206万元，其中：十标段质保金为3.081182万元，根据合同约定

还未到支付节点,审计结余资金 43.355024 万元,计划于 2024 年 11 月继续用于该项目的后续更新改造。

评价组根据项目文档资料和实地调研结果,以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 92.04 分,根据《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(获财效〔2022〕1 号)规定的绩效等级划分标准,绩效等级为“优”。

总体来看,获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目立项决策层面,立项依据充分,立项程序规范,专项债券申请合规,手续完备,项目文本科学;项目过程管理层面,专项债券资金使用合规,项目管理制度健全,制度执行有效,政府采购流程合规,专项债券信息管理规范;产出层面,设备及实验室改造验收合格,项目整体完成度较高,成本控制有效。项目建成后,全面提升了获嘉县公共检验检测中心食品、药品、农(畜)产品、工业产品、精细化工产品及其计量检定检验检测能力,并在提升产品质量安全水平等方面起到了应有的效果。

但是从评价组深入调研分析来看,项目目前存在以下问题: 1.合同管理不规范、执行不到位; 2.项目资产设备使用率较低。

针对以上问题,评价组提出以下改进建议: 1.建立合同审核和监督机制,加强合同管理; 2.加快相关资质申办进度,提高设备使用率。

目 录

摘 要	1
一、基本情况	1
(一) 项目立项背景与目的	1
(二) 项目主要内容及实施情况	2
(三) 项目资金来源及支出情况	3
(四) 项目的组织及管理	10
(五) 项目绩效目标	13
二、绩效评价工作开展情况	15
(一) 绩效评价目的、对象和范围	15
(二) 绩效评价依据	16
(三) 评价指标体系	19
(四) 绩效评价原则、方法和标准	22
(五) 绩效评价工作过程	24
三、综合评价情况及评价结论	26
(一) 综合评价情况	26
(二) 评价结论	27
四、绩效评价指标分析	28
(一) 项目决策情况	28
(二) 项目过程情况	33
(三) 项目产出情况	38
(四) 项目效益情况	41
五、主要经验及做法、存在的主要问题	44

(一) 主要经验及做法	44
(二) 存在的主要问题	44
六、有关建议	45
(一) 建立合同审核和监督机制，加强合同管理	45
(二) 加快相关资质申办进度，提高设备使用率	46
七、其他需要说明的问题	46
八、附件	46
附件 1：评价指标体系及评分表	47
附件 2：满意度调查问卷	84
附件 3：满意度调查分析报告	89

获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目 绩效评价报告

为贯彻落实《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（获办文〔2021〕8号）、《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1号）等文件精神，进一步强化预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，河南云域网络科技有限公司受获嘉县财政局委托，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，对获嘉县公共检验检测中心负责实施的“公共检验检测中心能力提升建设项目”开展绩效评价，形成此报告。

一、基本情况

（一）项目立项背景与目的

检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业 and 用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。质量检验检测行业是随着社会对使用产品的质量、对生活健康水平、对生产生活的安全性、对社会环境保护等方面的需求不断加大，检测技术的不断进步而逐渐发展起来的行业。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断

拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对于食品安全、质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。

获嘉县公共检验检测中心是 2019 年机构改革以来新组建的事业单位，承担政府相关职能部门和司法部门下达的有关食品、药品、保健食品、化妆品、农产品、畜禽产品、兽药、饲料、质量计量等有关产（商）品风险监测、质量检验、评价性检验、委托检验和司法鉴定检验等任务。因原有仪器设备随着检验标准、检验技术不断更新，现有检测能力已不能满足政府部门下达的检验要求以及其他的委托检验检测需求，获嘉县公共检验检测中心根据获嘉县人民政府会议精神，提出对获嘉县公共检验检测中心进行提质改造，并于 2021 年 11 月 8 日经过获嘉县发展和改革委员会批准《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2021〕79 号），同意项目实施。通过本项目实施，食品、农畜产品检验项目将基本覆盖国家监督抽查项目要求，不但能满足政府部门检验任务的要求，还将积极开拓市场，增加业务收入。

（二）项目主要内容及实施情况

本项目建设地点位于获嘉县中山路与凤翔路交叉路口向北 200 米处获嘉县公共检验检测中心。根据中德华建（北京）国际工程技术有限公司出具的《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告》和《关于获嘉县公共

检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2021〕79号），项目主要建设内容和规模为：新购置食品、农产品检测类设备43类（45台/套），精细化工检测类设备7类（7台/套），计量器具校准类设备3类（包含通风机能效检测装置1套、可燃有毒有害气体报警器检定装置1套、车检机构校准装置1套），以及实验室室内改造工程（改造面积1,092 m²）。

经评价组查阅项目资料及实地调研，获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目于2023年3月初设备购置均已调试安装并验收完毕，并于2024年2月完成项目审计工作。

（三）项目资金来源及支出情况

1.项目预算及资金来源情况

根据《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2021〕79号）文件，项目总投资估算2,137.53万元，资金来源财政投入337.53万元和地方政府专项债券1,800.00万元，其中：工程费用1,892.74万元（占比88.55%），工程建设其他费用65.86万元（占比3.08%），预备费97.93万元（占比4.58%），建设期利息81.00万元（占比3.79%）。专项债券资金发行情况见下表1-1。

表 1-1 专项债券发行情况表

单位：万元

发行债券名称	发行利率	发行时间	还本付息方式	期限	发行金额
--------	------	------	--------	----	------

发行债券名称	发行利率	发行时间	还本付息方式	期限	发行金额
2022年河南省和社会事业专项债券（九期）--2022年河南省政府专项债券（二十六期）	3.29%	2022-04-28	每半年付息一次，到期还本	15年	1,800.00

2.项目资金使用情况

2022年9月，获嘉县公共检验检测中心委托中科高盛咨询集团有限公司完成项目采购任务。招标控制总价为1,782.0157万元，中标金额为1,765.417029万元，采购节约率为0.93%。具体中标单位及金额见下表1-2。

表 1-2 项目中标单位明细

单位：万元

序号	标段	中标单位	合同内容	招标控制价	中标金额
1	一标段	河南豫商科技发展有限公司	采购仪器设备及安装	300.00	299.00
2	二标段	河南海利达仪器有限公司	采购仪器设备及安装	234.00	229.00
3	三标段	河南缙发教育科技有限公司	采购仪器设备及安装	205.00	204.90
4	四标段	河南普睿衡仪器设备有限公司	采购仪器设备及安装	201.00	198.62
5	五标段	河南达捷进出口贸易有限公司	采购仪器设备及安装	70.00	69.19

序号	标段	中标单位	合同内容	招标控制价	中标金额
6	六标段	珠海冀华物产有限公司	采购仪器设备及安装	230.00	227.222
7	七标段	河南速捷计量仪器有限公司	采购仪器设备及安装	175.00	173.98
8	八标段	河南仁秀实业有限公司	采购仪器设备及安装	53.00	52.50
9	九标段	河南润辉科技有限公司	采购仪器设备及安装	72.00	71.216
10	十标段	河南东鼎建设工程有限公司	检测中心一、二、三层（部分房间）的装饰装修、给排水、电气等工程的改造（不包含专业消防工程）	98.23601	97.945249
11	十一标段	河南捷希医疗科技有限公司	检测中心一、二、三层（部分房间）的实验室设备、污水处理和暖通设备的采购及安装	143.77969	141.84378
合计				1,782.0157	1,765.417029

获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目 2022 年申请发行专项债券资金 1,800.00 万元，截至评价期结束，项目已完成竣工审计工作。根据项目单位提供的《专项债审计情况表》、《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目专项债券项目进展情况说明》及项目财务资料，审计结算总价为 1,756.644976 万元，实际支出 1,753.563794 万元，预算执行

率为 99.82%，专项债券资金结余 46.436206 万元，其中：十标段质保金为 3.081182 万元，根据合同约定还未到支付节点，审计结余资金 43.355024 万元，计划于 2024 年 11 月继续用于该项目的后续更新改造。具体资金支付明细见下表 1-3。

表 1-3 项目资金支付明细

单位：万元

序号	实施内容	实施单位	合同金额	审计结算价	审减金额	已支付金额	余额	备注
1	一标段	河南豫商科技发展有限公司	299.00	293.70	5.30	293.70	-	
2	二标段	河南海利达仪器有限公司	229.00	223.45	5.55	223.45	-	
3	三标段	河南缙发教育科技有限公司	204.90	198.30	6.60	198.30	-	
4	四标段	河南普睿衡仪器设备有限公司	198.62	194.3938	4.2262	194.3938	-	
5	五标段	河南达捷进出口贸易有限公司	69.19	66.3568	2.8332	66.3568	-	
6	六标段	珠海冀华物产有限公司	227.222	221.87588	5.34612	221.87588	-	

序号	实施内容	实施单位	合同金额	审计结算价	审减金额	已支付金额	余额	备注
7	七标段	河南速捷计量仪器有限公司	173.98	171.2402	2.7398	171.2402	-	
8	八标段	河南仁秀实业有限公司	52.50	51.385	1.115	51.385	-	
9	九标段	河南润辉科技有限公司	71.216	66.656	4.56	66.656	-	
10	十标段(建设工程施工合同)	河南东鼎建设工程有限公司	97.945249	102.706056	-4.760807	99.624874	3.081182	剩余为质保金
11	十一标段	河南捷希医疗科技有限公司	141.84378	141.53124	0.31254	141.53124	-	
12	监理合同	河南连昇建筑工程有限公司	4.00	4.00	-	4.00	-	
13	建设工程设计	崛起建筑装饰集团有限公司	6.80	6.80	-	6.80	-	

序号	实施内容	实施单位	合同金额	审计结算价	审减金额	已支付金额	余额	备注
14	可行性研究报告咨询服务	中德华建（北京）国际工程技术有限公司河南分公司	3.00	3.00	-	3.00	-	
15	项目咨询服务	河南中方实验室技术有限公司	9.75	9.75	-	9.75	-	
16	项目事前绩效评估报告	河南佳尔和企业管 理咨询有限公司	1.50	1.50	-	1.50	-	
合计			1,790.467029	1,756.644976	33.822053	1,753.563794	3.081182	

3.专项债券还本付息情况

截至评价期结束，项目共付息 118.44 万元，其中 2022 年付息 29.61 万元，2023 年付息 59.22 万元，2024 年付息 29.61 万元。由于该项目还未完全进入运营阶段，上述专项债券利息均由获嘉县财政局先行垫付，具体付息情况见下表 1-4。

表 1-4 项目专项债券付息情况表

单位：万元

序号	付息时间	付息金额
1	2022 年 10 月 28 日	29.61
2	2023 年 4 月 28 日	29.61
3	2023 年 10 月 28 日	29.61
4	2024 年 4 月 28 日	29.61
总计		118.44

(四) 项目的组织及管理

1.相关方职责

获嘉县发展和改革委员会：负责项目立项、可行性研究报告等审核与批复。

获嘉县财政局：负责项目预算审核、预算批复、资金拨付及投资评审等工作；做好专项债券监管政策宣传贯彻、项目申报、信息披露工作及本息兑付工作；督促主管部门（单位）落实管理责任，加快项目建设进度和支出进度，尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。

获嘉县公共检验检测中心：项目主管部门及项目单位，

负责项目准备、方案编制、政府债券申报使用、项目实施运营和监督等工作；负责将专项债券项目对应的收入及时足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。

招标代理机构（中科高盛咨询集团有限公司）：负责项目招标代理工作，完成项目采购的招标、评标、发布中标通知书等相关工作。

施工单位（涉及 11 个中标单位）：施工单位按照所签署合同内容，履行合同义务，并接受获嘉县公共检验检测中心监督约束。

监理单位（河南连昇建筑工程管理有限公司）：承担项目第十标段及十一标段建设工程监理工作，对该项目两个标段建设全过程进行监督。

2.项目管理情况

（1）项目实施管理情况：①该项目立项阶段由项目单位依据各级人民政府的有关决策部署、区域发展规划、部门职能等提出项目立项申请，按规定开展调研论证、办理前期规划、用地、环评等手续，经获嘉县发展和改革委员会等部门审批通过后开始实施。②实施阶段由项目单位通过招标代理机构公开招标确定施工单位，由施工单位按合同要求开展项目建设，实施过程中项目单位各部门按照各自职责分工及业务、财务管理制度对项目建设过程进行监督、管理，并按项目建设进度和合同约定申请、支付项目资金。③项目验收阶段一至九标段为施工方履约完毕及时向项目单位提出验

收申请，项目单位在收到验收申请后 5 个工作日内组织验收，并成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作，验收合格后 10 日内，项目单位出具验收报告；十至十一标段由施工单位提出验收申请，项目单位组织施工单位、监理单位共同开展验收工作，并出具项目竣工验收报告。④项目运营阶段，由项目单位负责进行运营管理，遵循注重工作人员的基本功训练与专业训练，一般培养与重点培养，当前需要与长远需要三结合的原则，培养一支具备开拓型、智力型的科技队伍。落实岗前培训，定期对工作人员进行“基础理论、基本知识、基本技能”的训练与考核。

（2）资金管理情况：本项目严格执行专项债券资金专款专用的原则，执行严格的流入管理和流出管理制度，加强资金的使用与管理。①资金拨付使用管理。专项债券资金发行后下达至获嘉县财政局，项目单位根据实际需求向县财政局提交资金使用申请，经县财政局审批通过后，将对应金额的债券资金拨付至最终收款方。②专项债券还本付息管理。该项目计划共申请专项债券资金 1,800.00 万元，实际已发行 1,800.00 万元，期限 15 年，在债券存续期每半年付息一次，在债券存续期的第 6 年至 10 年每年 4 月 28 日偿还本金的 5%，第 11 年至 15 年每年 4 月 28 日偿还本金的 15%，已兑付本金不再计息。专项债券收入、支出、还本、付息纳入政

府性基金预算管理。本项目债券本息偿还来源均为项目运营收益，项目收益来源主要为食品、农畜产品、精细化工产品等产品质量检测收入和计量校准收入，其中建设期利息由县财政先行垫付。项目运营期收入由项目单位负责收取，在债券还本付息前足额上缴财政，以保障债券资金的及时偿付。

3.利益相关方

本项目涉及的利益相关方包括：

（1）项目拨款单位：获嘉县财政局；

（2）项目主管部门和项目单位：获嘉县公共检验检测中心；

（3）项目施工单位：河南豫商科技发展有限公司、河南海利达仪器有限公司、河南缙发教育科技有限公司、河南普睿衡仪器设备有限公司、河南达捷进出口贸易有限公司、珠海冀华物产有限公司、河南速捷计量仪器有限公司、河南仁秀实业有限公司、河南润辉科技有限公司、河南东鼎建设工程有限公司、河南捷希医疗科技有限公司；

（4）项目受益方：获嘉县检验检测中心工作人员、受检对象及获嘉县市场监督管理局工作人员。

（五）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过本项目实施，食品、农畜产品检验项目将基本覆盖国家监督抽查项目要求，不但能满足政府部门检验任务的要求，还将积极开拓市场，增加业务收入。

(1) 项目预计总投资 2,137.53 万元，新购置食品、农产品检测类设备 43 类（45 台/套），精细化工检测类设备 7 类（7 台/套），计量器具校准类设备 3 类（包含通风机能效检测装置 1 套、可燃有毒有害气体报警器检定装置 1 套、车检机构校准装置 1 套），以及实验室室内改造工程（改造面积 1,092 m²）。

(2) 项目计划建设周期 18 个月，预计开工日期 2022 年 3 月，预计完工时间 2023 年 9 月。

(3) 本项目的建设将大大提升获嘉县公共检验检测中心食品实验室检测能力，确保全县人民群众舌尖上的安全。

2.项目具体目标

评价组对项目单位提供的绩效目标表进行了全面梳理，梳理后的项目绩效目标表见下表 1-5。

表 1-5 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤2,137.53 万元
产出指标	数量指标	新购置食品、农产品检测类设备	≥45 台/套
		精细化工检测类设备	≥7 套
		计量器具校准类设备	≥6 套
		实验室室内改造工程	≥1092 平方米
	质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%
		工程竣工配套基础正常使用率	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	时效指标	项目按时开工建设	按计划完成
		项目建设完工时间	按计划完成
效益指标	经济效益指标	运营期间收入	≥500.00 万元
	社会效益指标	获嘉县食品实验室检测能力	提升
		质量基础设施建设	完善
		检验项参数的覆盖率	提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次绩效评价依据《河南省财政厅关于开展 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5 号）文件精神，结合地方政府专项债券资金的特点，通过对“公共检验检测中心能力提升建设项目”进行客观、公正的综合评判，综合考察分析专项债券资金投入和使用管理情况、项目实施管理及绩效目标的完成程度及效果等情况，总结分析项目实施过程中存在的主要问题及原因，提出改进意见和建议，为提升债券资金使用的经济性、效益性和效率性提供决策参考。

2.评价对象

本次绩效评价对象为：公共检验检测中心能力提升建设

项目。

3.评价资金范围

本次绩效评价资金范围：项目涉及地方政府专项债券1,800.00万元。

4.评价时间范围

本次绩效评价时间：截至2024年9月。

（二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；其他相关材料等。

本次项目支出绩效评价的依据主要如下：

1.预算绩效管理类

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（2）《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）；

（4）《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

（5）《河南省财政厅关于印发<河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（豫财效〔2020〕10号）；

(6) 《河南省财政厅关于印发<河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》(豫财债〔2022〕13号)；

(7) 《河南省财政厅关于开展2023年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》(豫财债函〔2024〕5号)；

(8) 《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(新办文〔2020〕10号)；

(9) 《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(新财效〔2021〕2号)；

(10) 《新乡市财政局关于印发<新乡市财政绩效评价指南>》(新财效〔2022〕4号)；

(11) 《中共获嘉县委办公室 获嘉县人民政府办公室关于贯彻落实新办文〔2020〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》(获办文〔2021〕8号)；

(12) 《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》(获财效〔2022〕1号)。

2.业务管理类

(1) 《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》；

(2) 《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》(第16号)；

(3) 《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)；

(4) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

(5) 《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206号）；

(6) 《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）；

(7) 《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（豫政〔2021〕13号）；

(8) 《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的请示》（获检验字〔2021〕7号）；

(9) 《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2021〕79号）；

(10) 《获嘉县人民政府会议纪要》（〔2021〕32号）；

(11) 《河南省财政厅关于下达 2022 年河南省政府一般债券（四期）和专项债券（二十一至三十期）资金的通知》（豫财债〔2022〕31号）；

(12) 《获嘉县财政局关于下达 2023 年县级部门收支预算的通知》（获财预〔2023〕1号）。

3.其他类

(1) 项目事前绩效评估报告、绩效目标表、监控表及监控报告、自评表及自评报告；

(2) 专项债券项目三评一案、财政部门的预算批复、招投标文件、相关管理制度、合同书、验收报告、项目执行

的财务及业务资料、反映项目产出及效果的佐证材料等。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标设计主要根据《河南省财政厅关于开展 2023 年度专项债券项目资金重点绩效评价工作的通知》（豫财债函〔2024〕5 号），并参考《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1 号）中共性指标体系的设计，同时结合获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目实施情况及专项债券资金具体使用情况，确定绩效评价指标体系框架。绩效评价组按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑路径分层设定一级指标 4 个，下设二级指标 14 个，三级指标 36 个。指标数据主要来源于政策文件、基础数据采集表、财务材料、访谈、现场核查、问卷调查等。具体指标体系框架构成见下表 2-1。

表 2-1 项目绩效评价指标体系简表

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
A 决策 (13 分)	A1 项目立项	4.00	A1.1 立项依据充分性	2.00
			A1.2 立项程序规范性	2.00
	A2 专项债券申请情况	5.00	A2.1 支持领域合规性	1.00
			A2.2 手续办理完备性	2.00
			A2.3 项目文本科学性	2.00
	A3 绩效管理情况	4.00	A3.1 事前绩效评估规范性	1.00
			A3.2 绩效目标设定规范性	1.00
			A3.3 绩效目标合理性	1.00
			A3.4 绩效指标明确性	1.00

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重
B 过程 (21分)	B1 资金管理	7.00	B1.1 专项债券纳入预算管理规范性	1.00
			B1.2 资金使用规范性	3.00
			B1.3 资金支出进度	2.00
			B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况	1.00
	B2 项目管理	12.00	B2.1 项目管理制度健全性	2.00
			B2.2 制度执行有效性	2.00
			B2.3 政府采购合规性	2.00
			B2.4 合同执行有效性	4.00
			B2.5 项目运营管理规范性	2.00
	B3 资产管理	1.00	B3.1 项目竣工后资产备案	1.00
B4 其他管理	1.00	B4.1 专项债券项目信息管理规范性	1.00	
C 产出 (34分)	C1 产出数量	10.00	C1.1 设备采购完成率	8.00
			C1.2 实验室改造工程完成率	2.00
	C2 产出质量	16.00	C2.1 设备质量合格率	5.00
			C2.2 设备验收通过率	5.00
			C2.3 工程验收合格率	2.00
			C2.4 设备使用率	2.00
			C2.5 设备发生故障次数	2.00
	C3 产出时效	4.00	C3.1 项目完成及时性	4.00
C4 产出成本	4.00	C4.1 项目成本节约率	4.00	
D 效益	D1 社会效益	15.00	D1.1 实验室检测能力提升	5.00

一级指标	二级指标	权重	三级指标	权重	
(32分)			情况		
			D1.2 未发生危害人民群众生命安全事件	5.00	
			D1.3 检测工作人员能力提升情况	5.00	
		D2 可持续影响	5.00	D2.1 项目持续发挥作用	5.00
	D3 满意度	12.00	D3.1 实验室工作人员满意度	5.00	
			D3.2 受检对象满意度	5.00	
			D3.3 获嘉县市场监督管理局满意度	2.00	
合计		100.00		100.00	

1.决策类指标：占权重为 13 分，主要从项目立项、专项债券申请情况、绩效管理情况 3 个维度考察。包括立项依据充分性、立项程序规范性、支持领域合规性、手续办理完备性、项目文本科学性、事前绩效评估规范性、绩效目标设定规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等。包括 3 个二级指标，9 个三级指标。

2.过程类指标：占权重为 21 分，主要从资金管理、项目管理、资产管理、其他管理 4 个维度考察。包括专项债券纳入预算管理规范性、资金使用规范性、资金支付进度、专项债券本息偿还计划执行情况、项目管理制度健全性、制度执行有效性、政府采购合规性、合同执行有效性、项目运营管理规范性、项目竣工后资产备案、专项债券项目信息管理规

范性等。包括 4 个二级指标，11 个三级指标。

3.产出类指标：占权重为 34 分，主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个维度考察。包括设备采购完成率、实验室改造工程完成率、设备质量合格率、设备验收通过率、工程验收合格率、设备使用率、设备发生故障次数、项目完成及时性、项目成本节约率等。包括 4 个二级指标，9 个三级指标。

4.效益类指标：占权重为 32 分，主要从社会效益、可持续影响、满意度 3 个维度考察。包括实验室检测能力提升情况、未发生危害人民群众生命安全事件、检测工作人员能力提升情况、项目持续发挥作用、实验室工作人员满意度、受检对象满意度、获嘉县市场监督管理局满意度等。包括 3 个二级指标，7 个三级指标。

绩效评价标准依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

（四）绩效评价原则、方法和标准

1.评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，全面系统分析项目的立项决策、过程管理、成果产出和实施效果，综合评价项目实施及资金支出的效益。

2.评价方法

本次绩效评价根据项目实际情况，坚持定量优先、定量与定性相结合的评价方法，主要采用以下方法：

（1）比较法

评价组通过对获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目实施情况与绩效相关数据资料进行核对比较，综合分析项目目标设立是否明确、资金投入是否科学、项目实施内容是否合理、项目效果是否达到预期目标等，为指标评分提供数据支撑。

（2）因素分析法

评价组在对该项目概况初步了解后，对收集到的建设项目相关的制度文件、可行性研究报告、实施方案、专项债券资金申请拨付及支出、招投标文件资料、验收报告、设备使用记录等相关资料进行研读，并查阅与该项目实施密切相关的规章制度、文件规定，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部原因，进而对项目的整体情况分析，结合本项目的特点确定评价的总体思路及相应的指标。

（3）综合评价法

评价组通过设立项目执行、效果等维度的评价指标，构建客观、科学的综合评价指标体系，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目实施成效进行综合、全面的评价。

（4）公众评判法

评价组针对该项目实施进度、质量、监督管理情况以及

受益对象的现实需求等方面设计调查问卷，了解获嘉县公共检验检测中心工作人员和项目受检对象对项目实施、管理的满意程度和相关意见、建议，分析项目实施、管理是否符合受益对象的现实需求。

(5) 社会调查法

评价组通过现场勘查、访谈调研、资料收集与数据复核等方式对该项目实施完成情况及绩效目标的实现程度进行调查，并对项目产出和项目绩效进行综合分析。

3.评价标准

本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，对绩效指标完成情况进行比较，具体包括：

(1) 计划标准：是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

(2) 行业标准：是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 其他标准：财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(五) 绩效评价工作过程

本次绩效评价分为四个阶段，分别为前期准备、方案制定、评价实施、成果出具，工作期间为 2024 年 6 月 4 日至 2024 年 9 月 20 日，将于 2024 年 9 月 20 日前完成报告终稿提交获嘉县财政局，各阶段工作内容及时间安排见下表 2-2。

表 2-2 绩效评价工作内容及时间安排

阶段	时间	工作内容
前期准备	6月4日	组建绩效评价工作组： 根据评价项目情况成立绩效评价小组，明确项目负责人，并配备相应数量和胜任相关评价工作的项目组成员。
	6月5日	对接财政局： 评价组与财政局相关人员沟通，明确本次绩效评价重点与关注要点。
		对接项目实施单位： 评价组对接项目实施单位负责人，下发绩效评价资料清单。
	6月6日—6月11日	了解项目政策背景： 评价组成员内部开展业务培训，收集、整理与绩效评价相关的政策文件、管理办法、行业规范等资料，对项目进行必要的研究和分析等。
	6月12日—6月18日	初步收集资料： 评价组在了解评价工作要求、相关评价政策文件的基础上，依据被评价项目，初步收集项目资料。
	6月19日—6月23日	开展前期调研： 评价组对收集到的项目资料进行汇总、分析和整理，在与项目单位沟通访谈的基础上，充分了解项目的背景、绩效目标、预算安排、实施内容、组织管理等，为制定切实可行的评价指标体系奠定基础。
方案制定	6月24日—7月15日	编制绩效评价工作方案： 评价组根据前期调研情况及收集到的资料，对项目资料进行梳理分析，运用科学的指标设计原则，并与项目单位充分沟通的基础上，编制绩效评价工作方案，科学设置评价指标体系。
	7月16日—7	评价工作方案征求意见： 评价组在完成评价工作

阶段	时间	工作内容
	月 24 日	方案初稿后，征求项目实施单位、资金业务科室意见，并依据意见对工作方案、指标体系等进行适当修改、完善。
评价实施	7 月 25 日—7 月 31 日	补充资料收集： 评价组依据制定好的评价方案及项目实施进展情况，视现有资料提交情况，对项目实施后期资料进行补充收集。
	8 月 1 日—8 月 25 日	现场调研及访谈： 主要包含听取介绍、实地调研、资料核查、分析评价、访谈等。根据项目特点，评价组选取不同的方式进行现场调研，收集评价所需基础数据，并对不同关联方进行访谈。 问卷调研： 评价组按照评价工作方案，针对项目指标，开展问卷调查，并对回收的问卷进行整理分析，得出调查结论。
成果出具	8 月 26 日—9 月 10 日	出具评价报告初稿： 在现场调研的基础上，评价组依据规定的报告文本格式和内容撰写评价报告，经三级复核后，形成评价报告初稿。
	9 月 11 日—9 月 18 日	评价报告初稿征求意见： 评价组向县财政局、项目实施单位报送评价报告初稿，征求相关方意见，修改后形成评价报告正式稿。
	9 月 20 日之前	报送正式评价报告： 评价组根据评价工作要求向县财政局报送并装订正式绩效评价报告。
	9 月 20 日之前	资料归档： 评价组在本次评价工作结束后，分类归集、整理、存档和保管存查各类资料。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

总体来看，获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目立项决策层面，立项依据充分，立项程序规范，专项债券申请合规，手续完备，项目文本科学；项目过程管理层面，专项债券资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效，政府采购流程合规，专项债券信息管理规范；产出层面，设备及实验室改造验收合格，项目整体完成度较高，成本控制有效。项目建成后，全面提升了获嘉县公共检验检测中心食品、药品、农（畜）产品、工业产品、精细化工产品及其计量检定检验检测能力，并在提升产品质量安全水平等方面起到了应有的效果。

但是从评价组深入调研分析来看，项目目前存在以下问题：1.合同管理不规范、执行不到位；2.项目资产设备使用率较低。

（二）评价结论

评价组根据项目文档资料和实地调研结果，以“科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关”为原则完成了项目评分。最终项目得分为 92.04 分，根据《获嘉县财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（获财效〔2022〕1 号）规定的绩效等级划分标准，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表 3-1。

表 3-1 项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重分	得分	得分率
A 决策	13.00	13.00	100.00%

一级指标	权重分	得分	得分率
B 过程	21.00	18.20	86.67%
C 产出	34.00	33.20	97.65%
D 效益	32.00	27.64	86.38%
合计	100.00	92.04	92.04%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

决策指标共 3 个二级指标，9 个三级指标，权重分值共 13.00 分，实际得分 13.00 分，得分率 100.00%。三级指标得分情况见下表 4-1。

表 4-1 决策指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A1 项目立项	4.00	4.00	100.00%
A1.1 立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
A1.2 立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2 专项债券申请情况	5.00	5.00	100.00%
A2.1 支持领域合规性	1.00	1.00	100.00%
A2.2 手续办理完备性	2.00	2.00	100.00%
A2.3 项目文本科学性	2.00	2.00	100.00%
A3 绩效管理情况	4.00	4.00	100.00%
A3.1 事前绩效评估规范性	1.00	1.00	100.00%
A3.2 绩效目标设定规范性	1.00	1.00	100.00%
A3.3 绩效目标合理性	1.00	1.00	100.00%
A3.4 绩效指标明确性	1.00	1.00	100.00%
合计	13.00	13.00	100.00%

A1.1 立项依据充分性：根据项目单位提供的资料：①项目立项符合《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》（国发〔2019〕5号）、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（豫政〔2021〕13号）等国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策要求，要点①得满分；②项目立项符合《市场监管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》、《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206号）、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）等相关行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为获嘉县公共检验检测中心，其部门职责包括“贯彻执行国家食品、药品、农畜产品、质量计量等有关产（商）品质量安全方面的法律法规和标准，依据有关规定实施检定、检验检测工作；开展食品、药品、保健食品、化妆品、农产品、畜禽产品、饲料、质量计量等有关产（商）品检测新方法、新技术的科研及推广工作”。项目立项与部门职责密切相关，要点③得满分；④项目资金来源于专项债券资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，要点④得满分；⑤经审阅部门职责和相关资料，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目

不存在交叉重复，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A1.2 立项程序规范性：①根据《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的请示》（获检验字〔2021〕7号），项目由获嘉县公共检验检测中心向获嘉县发展和改革委员会申请设立。2022年1月，项目实施方案已通过主管部门审核，要点①得满分；②2021年11月8日，获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2021〕79号），对项目立项进行了审核批复，同意项目的实施，并对项目建设内容、建设规模、总投资等事项作出了批复，要点②得满分；③通过查阅审核项目相关资料，项目审核程序、审批文件材料等符合相关要求，要点③得满分；④项目单位有效提供了项目可行性研究报告、事前绩效评估报告、专家论证意见、项目前期调研记录等，项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，要点④得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A2.1 支持领域合规性：根据项目单位提供的资料：①项目立项符合财政部《关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》（财库〔2020〕43号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）等文件规定的专项债券支持领域和方向，要点①得满分；②根据《获嘉县公共检验检测中心能力提升建

设项目可行性研究报告》及相关资料，获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目收益来源主要为食品、农畜产品、精细化工产品等产品质量检测收入和计量校准收入来实现，属于有一定收益的公益性项目，且能够达到自求平衡，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

A2.2 手续办理完备性：根据项目单位提供的资料及访谈了解：①本项目勘察、设计等工作由项目单位通过询价方式自行采购，符合《中华人民共和国国有企业采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关政策文件的规定，要点①得满分；②项目已经完成前期勘察、初步设计工作，要点②得满分；③项目施工前已按照政府采购的相关规定进行了设备采购及建设工程的公开招标和建设工程监理的自行采购，要点③得满分；④根据《获嘉县人民政府会议纪要》（〔2018〕62号）及获嘉县投资集团有限公司与获嘉县公共检验检测中心签订的《协议书》，获嘉县投资集团有限公司将坐落在获嘉县集聚区产学研中心的房屋无偿提供给获嘉县公共检验检测中心使用，无需办理用地手续，要点④得满分；⑤获嘉县环境保护局于 2021 年 11 月 23 日出具的《情况说明》，本项目不纳入建设环境影响评价管理，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A2.3 项目文本科学性：根据项目单位提供的资料：①项目实施方案中有明确规定项目资金来源、专项债券资金规模、债券发行时间和期限、风险机制等。专项债券计划申请

总额为 1,800.00 万元，于 2022 年 4 月 28 日发行，发行期限为 15 年，与实际需求相匹配，项目风险分析及风险控制措施合规科学，要点①得满分；②根据《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，对项目收入和成本的预测及偿债计划的设置合理，项目预期收益与专项债券规模相匹配，要点②得满分；③项目年度收支与项目全生命周期收支相匹配，要点③得满分；④债券存续期内，当项目收入、运营成本、专项债券利率等影响债券还本付息的因素在 $\pm 5\%$ 范围内发生不利变动的情况下，专项债券本息保障倍数仍然 > 1 ，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力，项目收益期可以满足专项债券还本付息要求，要点④得满分；⑤根据河南仟问律师事务所出具的《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目法律意见书》，结论性意见清晰明确，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

A3.1 事前绩效评估规范性：根据项目单位提供的资料：①项目单位根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（豫财预〔2019〕176号）文件要求，结合项目绩效目标表、项目实施方案、项目可行性研究报告等资料，对项目开展了事前绩效评估工作，事前绩效评估报告结论清晰明确，要点①得满分；②项目事前绩效评估报告规范、有效，要点②得满分。

综上，本项指标得 1.00 分。

A3.2 绩效目标设定规范性：根据项目单位提供的项目绩效目标申报表：①项目已设定绩效目标，要点①得满分；②项目绩效目标随同项目实施方案、事前评估报告等资料报送，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

A3.3 绩效目标合理性：评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标切实可行，要点①得满分；②项目绩效目标设置明确反映了项目计划的实施成效，要点②得满分；③项目绩效目标设置与实际工作内容具有相关性，要点③得满分；④项目绩效目标设置明确反映项目预期产出和效果，要点④得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

A3.4 绩效指标明确性：评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、受检对象满意度指标等，要点①得满分；②已填报的绩效指标较为清晰、可衡量，要点②得满分；③项目绩效目标设置与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

(二) 项目过程情况

过程指标共 4 个二级指标，11 个三级指标，权重分值共 21.00 分，实际得分 18.20 分，得分率 86.67%。三级指标得分情况见下表 4-2。

表 4-2 过程指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
B1 资金管理	7.00	7.00	100.00%
B1.1 专项债券预算管理规范性	1.00	1.00	100.00%
B1.2 资金使用规范性	3.00	3.00	100.00%
B1.3 资金支出进度	2.00	2.00	100.00%
B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况	1.00	1.00	100.00%
B2 项目管理	12.00	9.20	76.67%
B2.1 项目管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
B2.2 制度执行有效性	2.00	2.00	100.00%
B2.3 政府采购合规性	2.00	2.00	100.00%
B2.4 合同执行有效性	4.00	1.20	30.00%
B2.5 项目运营管理规范性	2.00	2.00	100.00%
B3 资产管理	1.00	1.00	100.00%
B3.1 项目竣工后资产备案	1.00	1.00	100.00%
B4 其他管理	1.00	1.00	100.00%
B4.1 专项债券项目信息管理规范性	1.00	1.00	100.00%
合计	21.00	18.20	86.67%

B1.1 专项债券预算管理规范性：评价组通过核查项目单位财务资料：①项目专项债券资金收支情况、支付利息等已全部纳入财政预算管理，要点①得满分；②获嘉县检验检测中心收到和使用专项债券资金按照规定预算收支科目单独核算、全面管理，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

B1.2 资金使用规范性：评价组通过核查项目单位财务资料：①项目专项债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，要点①得满分；②项目专项债券资金从拨付到

使用有完整的审批程序和手续，要点②得满分；③项目专项债券资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④项目专项债券资金使用均用于本项目支出，未发现用于偿还债务、经常性支出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出，要点④得满分；⑤查阅项目单位财务资料，项目单位依据施工进度、合同约定向县财政局提交资金使用申请，经县财政局审批通过后，由获嘉县财政国库支付中心将对应金额的债券资金拨付至最终收款方，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，要点⑤得满分。综上，本项指标得 3.00 分。

B1.3 资金支出进度：根据项目单位提供的项目资金支出明细：①2022 年 4 月 28 日发行专项债券资金 1,800.00 万元，实际到位 1,800.00 万元，截至评价期结束，该项目已完成竣工审计工作，最终审计结算价为 1,756.644976 万元，项目资金实际支出 1,753.563794 万元，资金支出进度为 99.82%，因剩余资金为十标段质保金，不到支付节点，要点①得满分；②经评价组访谈及查阅相关资料，资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况：评价组通过调研和访谈，获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目专项债券累计发行额 1,800.00 万元，截至评价期，该专项债券已付息 4 次，累计付息 118.44 万元，按照规定时间、规定金额进行偿还。该项目专项债券尚未到还本期限，不涉及债券还本。

综上，本项指标得 1.00 分。

B2.1 项目管理制度健全性：项目单位提供了相应的财务管理、内部控制管理及公共检验检测中心制度汇编（分页）等相关业务制度，对项目单位的资金管理、资产管理、采购管理、财务审批报账管理和实验室制度及职责等进一步明确规范化，其内容合法、合规、完整，符合评价要点①②。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.2 制度执行有效性：根据项目单位提供的资料结合评价组调研结果：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②根据《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目实施方案》，该项目计划建设周期为 18 个月，预计完工时间为 2023 年 9 月，而评价组根据相关资料及访谈了解该项目整体于 2023 年 3 月初全部实施完成，在实施方案计划周期内实施完成，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.3 政府采购合规性：评价组通过核查采购招标资料：①该项目前期咨询、设计、监理等工作由项目单位自行采购，设备采购及建设施工采取公开招标方式进行，采购活动按照政府采购相关要求选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关流程，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B2.4 合同执行有效性：经评价组核查：①获嘉县公共检

检验检测中心能力提升建设项目签订合同中明确双方职责、服务内容、交货时间、质量要求、验收要求等，以及相关约束性条款，但个别合同中有明显错误，如：1标段合同名称填写为“获嘉县公共检验检测中心能力提升项目(九标段)合同”，10标段建设项目监理合同中监理期限填写为“2022.1.1至2022.1.1”，要点①扣10%权重分；②该项目所签订的合同齐全并及时进行归档，要点②得满分；③项目实施过程中基本按照签订的合同执行，但在合同执行过程中发现存在合同管理不规范、执行不到位等问题，如：一是可行性研究报告咨询服务、项目咨询服务及事前绩效评估报告服务未按合同约定的付款方式付款，可行性研究报告咨询服务合同中约定的付款方式“委托方受托方双方签订合同后3个工作日内，委托方向受托方支付合同额的50%，作为项目的启动费用；在项目通过发改委评审后两个月内委托方将剩余的50%合同额，支付给受托方”，合同签订时间为2021年10月22日，实际于2022年6月6日一次性支付完成；二是项目验收不规范，设备采购合同中验收要求合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人，1-9标段采购合同价均在50万元以上，经评价组查看验收报告，验收组人员共计4人，不符合合同要求。要点③不得分。综上，得30%权重分，本项指标得1.20分。

B2.5 项目运营管理规范性：①经评价组核查，项目单位具备《检验检测机构资质认定证书》、《农产品质量安全检

测机构考核合格证书》等相关资质认证，可从事相应检验检测及计量等活动，要点①得满分；②项目单位针对本项目的实施制定了《获嘉县公共检验检测中心能力提升项目运营管理的实施方案》，经现场访谈了解项目单位正在积极完善相关资质申请认定，运营准备工作充分，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。

B3.1 项目竣工后资产备案：经评价组核查，项目竣工后项目单位及时进行了相关仪器设备资产备案，备案信息准确完整，要点①②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

B4.1 专项债券项目信息管理规范性：评价组通过核查项目单位资料：①项目单位已按照规定将专项债券信息在地方政府债务管理系统中及时完整的进行录入和更新，要点①得满分；②评价组通过查询“中国地方政府债券信息公开平台”和“专项债券信息网”等网站，该项目申请和使用专项债券资金已按照政府信息公开有关规定和要求将专项债券项目有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”进行公开，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。

（三）项目产出情况

产出指标共 4 个二级指标，9 个三级指标，权重分值共 34.00 分，实际得分 33.20 分，得分率 97.65%。三级指标得分情况见下表 4-3。

表 4-3 产出指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
----	----	----	-----

指标	权重	得分	得分率
C1 产出数量	10.00	10.00	100.00%
C1.1 设备采购完成率	8.00	8.00	100.00%
C1.2 实验室改造工程完成率	2.00	2.00	100.00%
C2 产出质量	16.00	15.20	95.00%
C2.1 设备质量合格率	5.00	5.00	100.00%
C2.2 设备验收通过率	5.00	5.00	100.00%
C2.3 工程验收合格率	2.00	2.00	100.00%
C2.4 设备使用率	2.00	1.20	60.00%
C2.5 设备发生故障次数	2.00	2.00	100.00%
C3 产出时效	4.00	4.00	100.00%
C3.1 项目完成及时性	4.00	4.00	100.00%
C4 产出成本	4.00	4.00	100.00%
C4.1 项目成本节约率	4.00	4.00	100.00%
合计	34.00	33.20	97.65%

C1.1 设备采购完成率：评价组通过项目单位资料及现场核查：10 个采购标段实际采购数量全部按照计划完成，设备采购完成率 100%。根据评分规则，本项指标得 8.00 分。

C1.2 实验室改造工程完成率：经评价组核查：实验室改造工程已按照计划建设完成，完成率为 100%。根据评分规则，本项指标得 2.00 分。

C2.1 设备质量合格率：经评价组现场核查：①10 个标段采购的设备均有出厂合格证、制造商设备使用说明书等相关出厂证明，要点①得满分；②相关设备均经过国家认可的专业检测机构验收并出具检测检定报告，检测结果均合格，

设备满足检测要求，可投入正常使用，要点②得满分。综上，本项指标得 5.00 分。

C2.2 设备验收通过率：根据项目单位提供的验收报告显示，10 个标段购置的仪器设备全部验收合格，设备验收通过率为 100.00%。根据评分规则，本项指标得 5.00 分。

C2.3 工程验收合格率：经评价组核查，实验室改造工程已建设完成并验收，验收结果合格。根据评分规则，本项指标得 2.00 分。

C2.4 设备使用率：根据查看检验中心的《设备使用记录表》及现场访谈结果，设备购采购共 10 个标段，有 6 个标段设备已投入使用，开始运营，设备使用率为 60%。根据评分规则，本项指标得 1.20 分。

C2.5 设备发生故障次数：评价组通过查看检验检测中心的《设备使用记录表》《设备维修保养记录》及现场访谈结果，仪器设备均为新购进，截至评价期结束未发生故障。根据评分规则，本项指标得 2.00 分。

C3.1 项目完成及时性：经核查获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目预计完工时间为 2023 年 9 月底，项目实际于 2023 年 3 月已完成设备安装及验收工作，项目建设完成。根据评分规则，本项指标得 4.00 分。

C4.1 项目成本节约率：根据项目单位签订的涉及项目相关的合同总价为 1,790.467029 万元，项目建设完成经审计后的终审价为 1,756.644976 万元，审减金额为 33.822053 万元，

成本节约率=[(1,790.467029-1,756.644976)/1,790.467029]×100%=1.89%。根据评分规则，本项指标得4.00分。

(四) 项目效益情况

效益指标共3个二级指标，7个三级指标，权重分值共32.00分，实际得分27.64分，得分率86.38%。三级指标得分情况见下表4-4。

表4-4 效益指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
D1 社会效益	15.00	13.00	86.67%
D1.1 实验室检测能力提升情况	5.00	5.00	100.00%
D1.2 未发生危害人民群众生命安全事件	5.00	3.00	60.00%
D1.3 检测工作人员能力提升情况	5.00	5.00	100.00%
D2 可持续影响	5.00	5.00	100.00%
D2.1 项目持续发挥作用	5.00	5.00	100.00%
D3 满意度	12.00	9.64	80.33%
D3.1 实验室工作人员满意度	5.00	2.64	52.80%
D3.2 受检对象满意度	5.00	5.00	100.00%
D3.3 获嘉县市场监督管理局满意度	2.00	2.00	100.00%
合计	32.00	27.64	86.38%

D1.1 实验室检测能力提升情况：经评价组核查：根据公共检验检测中心提供的《农产品质量安全检测机构考核合格证书附表》、《检验检测机构资质认定证书附表》，2020年12月9日河南省质量技术监督局批准的食品检测共125项参数，2023年8月14日河南省市场监督管理局批准获嘉县公

共检验检测中心检验检测的能力范围(食品)相关检测共 264 项参数,检测水平有效提升 111.20%; 2021 年 3 月 9 日河南省农业农村厅批准的农产品检测共 41 项参数,2023 年 10 月 30 日河南省农业农村厅批准获嘉县公共检验检测中心授权检测范围及限制要求相关农产品检测共 124 项参数,检测水平有效提升 202.44%。根据评分规则,本项指标得 5.00 分。

D1.2 未发生危害人民群众生命安全事件: 经评价组核查:2023 年 12 月 30 日获嘉县市场监督管理局网站公布《2023 年获嘉县市场监督管理局农产品抽检 3 批次不合格信息公示第十期》、2024 年 04 月 11 日公布《2024 年获嘉县市场监督管理局监督抽检 4 批次不合格信息公示第二期》、2024 年 06 月 27 日公布《2024 年获嘉县市场监督管理局抽检 5 批次不合格信息公示第五期》,以上不合格产品均未危害人民群众生命安全。根据评分规则,本项指标得 3.00 分。

D1.3 检测工作人员能力提升情况: 经评价组现场查看人员档案记录及访谈了解:①相关检测工作人员均进行了仪器设备技术培训,并取得培训合格证书,要点①得满分;②检测工作人员取得了检验检测机构资质认定内审员证,要点②得满分。综上,本项指标得 5.00 分。

D2.1 项目持续发挥作用: 经评价组核查:①项目单位建立有《获嘉县公共检验检测中心能力提升项目运营管理的实施方案》、实验室里设有《液质联用仪器室管理制度》、《医检室检定员职责》、《检测室主任职责》等各项管理制度,

以保障设备使用寿命及实验室日常工作正常运行，要点①得满分；②目前，获嘉县公共检验检测中心成为全市首家通过“双认证”的县级农产品质量安全检测机构，实现了检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）的双覆盖，项目实施以来，根据政府及职能部门下达的任务要求，共抽检 500 批左右产品，涵盖粮油、酒、蔬菜、肥料等多个产品种类，且正在积极申办全部资质工作，在能够有效保障政府及职能部门下达的任务要求的同时，积极拓展市场，增加业务创收，要点②得满分。综上，本项指标得 5.00 分。

D3.1 实验室工作人员满意度：公共检验检测中心实验室工作人员共 10 名，评价组通过现场调研形式获得满意度有效问卷 8 份，调查结果显示检验中心实验室工作人员的总体满意度为 85.55%，工作人员满意度得分=5 分-(95%-85.55%) \times 5% \times 5 分=2.64 分。根据评分规则，本项指标得 2.64 分。

D3.2 受检对象满意度：评价组根据项目特点针对检测中心受检对象设计了满意度调查问卷，通过网络调研形式共计收回有效问卷 30 份，调查结果显示受检对象的总体满意度为 97.29%。根据评分规则，本项指标得 5.00 分。

D3.3 获嘉县市场监督管理局满意度：评价组通过网络调查问卷形式获得满意度有效问卷 4 份，调查结果显示获嘉县市场监督管理局工作人员的总体满意度为 100%。根据评分规则，本项指标得 2.00 分。

五、主要经验及做法、存在的主要问题

（一）主要经验及做法

获嘉县公共检验检测中心通过引进新型检测设备，于2023年8月初取得食品检验检测机构资质认定评审（MA认证），扩展食品检验参数267项，11月初取得农产品质量安全检测机构考核（CATL认证），扩展农畜产品检验124项，至此，获嘉县公共检验检测中心成为全市首家通过“双认证”的县级农产品质量安全检测机构，实现了检验检测机构资质认定（CMA）和农产品质量安全检测机构考核（CATL）的双覆盖，不但能保障县域内政府职能部门食品、药品、农（畜）产品、农资化肥国家监督抽查任务全覆盖，并且可以拓展新乡市及豫北地区所有食品、药品、农（畜）产品、农资化肥的检验检测项目，大大提高了产品质量安全检测能力，有效增加业务创收，为获嘉县经济社会高质量发展做出贡献。

（二）存在的主要问题

1.合同管理不规范、执行不到位

获嘉县公共检验检测中心在合同管理方面存在瑕疵，主要表现为：（1）一标段合同名称填写为“获嘉县公共检验检测中心能力提升项目（九标段）合同”，十标段建设项目监理合同中监理期限填写为“2022.1.1至2022.1.1”；（2）可行性研究报告咨询服务、项目咨询服务及事前绩效评估报告服务未按照签订的合同执行，合同履行进度均晚于合同约定日期，如：可行性研究报告咨询服务合同中约定的付款方式

为“双方签订合同后3个工作日内，委托方向受托方支付合同额的50%；在项目通过发改委评审后两个月内委托方支付剩余的50%”。合同签订时间为2021年10月22日，实际于2022年6月6日一次性支付完成；（3）项目验收不规范，设备采购合同中验收要求：合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人，1-9标段采购合同价均在50万元以上。经评价组查看验收报告，验收组人员共计4人，不符合合同要求。出现以上问题的原因主要在于项目单位对合同管理工作并未给予高度的认识，对合同管理工作的投入力度缺乏，合同管理有效性有待加强。

2.项目资产设备使用率较低

本项目设备采购共10个标段，均安装完成并验收合格，但评价组通过查看检验中心的《设备使用记录表》及现场访谈了解，截至评价期，仅有6个标段的设备开始运营使用，资产设备使用率为60%。据了解因项目需要通过省级评审验收取得相关资质证书才能投入运营，现还有部分资质正在申办，所以设备未能全部投入运营使用。

六、有关建议

（一）建立合同审核和监督机制，加强合同管理

建议获嘉县公共检验检测中心对于合同签订建立合同审核和监督机制，如：1.由合同或档案管理人员，负责对所有合同进行审核和监督；2.财务及业务等相关部门定期进行合同履行情况的监督和评估，及时发现和处理合同执行情

况，确保多角度审查和风险控制；3.因特殊原因无法按照合同规定执行时，应及时签订补充协议，并按照合同管理制度和合同支付条款约定进行资金支付等。加强合同审核和监督机制等措施，能有效规范在签订合同过程中的行为，降低合同履约风险，提升项目单位的合同管理水平和风险防控能力。

（二）加快相关资质申办进度，提高设备使用率

本项目设备购采购共 10 个标段，均达到能够正常使用的条件，建议项目单位积极与相关部门沟通协商，加快剩余资质申办进度，让设备尽快投入运营，充分发挥资产的使用效益，保障项目收益能够尽早实现，避免出现债务偿还风险。

七、其他需要说明的问题

（一）本报告基础资料由获嘉县公共检验检测中心提供并对其真实性负责。

（二）本次评价工作是在评价小组和项目单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告，并保证本次评价过程及结论的客观公正。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定的影评价报告使用者予以关注。

八、附件

附件 1：评价指标体系及评分表

附件 2：满意度调查问卷

附件 3：满意度调查分析报告

附件 1：评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
A 决策 (13分)	A1 项目立项 (4分)	A1.1 立项依据充分性	2.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原	五项都符合得 100%权重，有一项不符合扣权重分的 20%。	根据项目单位提供的资料：①项目立项符合《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(豫政〔2021〕13号)等国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策要求，要点①得满分；②项目立项符合《市场监	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		管总局关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见》、《市场监管总局关于进一步推进检验检测机构资质认定改革工作的意见》（国市监检测〔2019〕206号）、《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T214-2017）等相关行业发展规划和政策要求，要点②得满分；③项目主管部门为获嘉县公共检验检测中心，其部门职责包括“贯彻执行国家食品、药品、农畜产品、质量计量等有关产（商）品质量安全方面的法律法规和标准，	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								<p>依据有关规定实施检定、检验检测工作；开展食品、药品、保健食品、化妆品、农产品、畜禽产品、饲料、质量计量等有关产（商）品检测新方法、新技术的科研及推广工作”。</p> <p>项目立项与部门职责密切相关，要点③得满分；④项目资金来源于专项债券资金，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，要点④得满分；⑤经审阅部门职责和相关资料，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		A1.2 立项程序规范性	2.00	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是否经过主管部门、发改、财政部门的审核批复，程序完备，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立，项目立项是否经过主管部门审核；②项目立项是否经过同级和上级发改部门审核通过；③审核程序、审批文件、材料是否符合相关要求；④事前是否已经过必要的绩效评估、可行性研究、风险评估、集体决策等。	四项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的25%。	①根据《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的请示》（获检验字〔2021〕7号），项目由获嘉县公共检验检测中心向获嘉县发展和改革委员会申请设立。2022年1月，项目实施方案已通过主管部门审核，要点①得满分；②2021年11月8日，获嘉县发展和改革委员会作出《关于获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告的批复》（获发改〔2021〕79号），对项目立项进行了审核批复，同意项目的实施，并对项目建设内容、	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								建设规模、总投资等事项作出了批复，要点②得满分；③通过查阅审核项目相关资料，项目审核程序、审批文件材料等符合相关要求，要点③得满分；④项目单位有效提供了项目可行性研究报告、事前绩效评估报告、专家论证意见、项目前期调研记录等，项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，要点④得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	A2 专项债券申	A2.1 支持领域	1.00	项目立项是否符合专项债券支持领	合规	评价要点：①项目立项是否符合财政部文件规定的专项债券支	两项都符合得 100%权重分，有一项不	根据项目单位提供的资料：①项目立项符合财政部《关于印发<地方政府债券发行管理办法>的通知》	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
	请情况(5分)	合规性		域和方向,是否属于有一定收益的公益性项目。		持领域和方向;②项目是否属于一定收益的公益性项目,且收益自求平衡。	符合扣权重的50%。	(财库〔2020〕43号)、《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)、《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》(财预〔2021〕61号)等文件规定的专项债券支持领域和方向,要点①得满分;②根据《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目可行性研究报告》及相关资料,获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目收益来源主要为食品、农畜产品、精细化工产品等产品质量检测收入和计量校准收入来实现,属于	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								有一定收益的公益性项目，且能够达到自求平衡，要点②得满分。综上所述，本项指标得 1.00 分。	
		A2.2 手续 办理 完备 性	2.00	项目前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序，前期手续办理及相关材料是否完整，用以反映和考核项目前期工作开	完备	评价要点：①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序；②项目是否完成前期勘察、初步设计；③项目施工前是否按规定进行工程、监理公开招标；④项目是否办理完成用地相关手续；⑤项目是否完	六项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 20%。	根据项目单位提供的资料及访谈了解：①本项目勘察、设计等工作由项目单位通过询价方式自行采购，符合《中华人民共和国国有企业采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关政策文件的规定，要点①得满分；②项目已经完成前期勘察、初步设计工作，要点②得满分；③项目施工前已按照政府采购的相关规定进行了设备采购及建设工程的公开招标和建设工程	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				展的规范情况。		成环评手续。		<p>监理的自行采购，要点③得满分；④根据《获嘉县人民政府会议纪要》（〔2018〕62号）及获嘉县投资集团有限公司与获嘉县公共检验检测中心签订的《协议书》，获嘉县投资集团有限公司将坐落在获嘉县集聚区产学研中心的房屋无偿提供给获嘉县公共检验检测中心使用，无需办理用地手续，要点④得满分；⑤获嘉县环境保护局于2021年11月23日出具的《情况说明》，本项目不纳入建设环境影响评价管理，要点⑤得满分。综上，本项指标得2.00分。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		A2.3 项目 文本 科学性	2.00	考察项目实施方案、收益和融资平衡方案、法律意见书等文件内容的科学性与合理性。	科学	评价要点：①项目实施方案明确的资金来源、专项债券申请额度与实际需求是否匹配（ $\text{额度匹配率} = \text{实际需求额度} / \text{项目申请额度} \times 100\%$ ）、发行时间和期限、风险机制等是否合规、科学；②收益和融资平衡方案对项目收入和成本的预测、对偿债计划的设置是否合理，项目预期收益与	五项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的20%。	根据项目单位提供的资料：①项目实施方案中有明确规定项目资金来源、专项债券资金规模、债券发行时间和期限、风险机制等。专项债券计划申请总额为1,800.00万元，于2022年4月28日发行，发行期限为15年，与实际需求相匹配，项目风险分析及风险控制措施合规科学，要点①得满分；②根据《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目收益与融资自求平衡专项评价报告》，对项目收入和成本的预测及偿债计划的设置合理，项目预期收益与专项债券规模	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						<p>专项债券规模是否匹配；③项目年度收支与项目全生命周期收支是否匹配；④项目整体收益与专项债券规模是否匹配；⑤法律意见书结论是否清晰明确。</p>		<p>相匹配，要点②得满分；③项目年度收支与项目全生命周期收支相匹配，要点③得满分；④债券存续期内，当项目收入、运营成本、专项债券利率等影响债券还本付息的因素在±5%范围内发生不利变动的情况下，专项债券本息保障倍数仍然>1，还本付息资金具有一定的稳定性与风险抵抗能力，项目收益期可以满足专项债券还本付息要求，要点④得满分；⑤根据河南仟问律师事务所出具的《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目法律意见书》，结论性意见清</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								晰明确，要点⑤得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	A3 绩效管理情况（4 分）	A3.1 事前绩效评估规范性	1.00	项目是否进行了事前绩效评估。	规范	评价要点：①项目是否开展事前绩效评估；②事前绩效评估报告是否规范、有效。	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	根据项目单位提供的资料：①项目单位根据《财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（财预〔2021〕61号）、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（豫财预〔2019〕176号）文件要求，结合项目绩效目标表、项目实施方案、项目可行性研究报告等资料，对项目开展了事前绩效评估工作，事前绩效评估报告结论清晰明确，要点①得满分；②项目事前绩效评估报	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								告规范、有效，要点②得满分。综上所述，本项指标得 1.00 分。	
		A3.2 绩效 目标 设定 规范 性	1.00	项目是否设定绩效目标，并随项目资料报送。	规范	评价要点：①项目是否设定绩效目标；②绩效目标是否随项目资料报送。	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	根据项目单位提供的项目绩效目标申报表：①项目已设定绩效目标，要点①得满分；②项目绩效目标随同项目实施方案、事前评估报告等资料报送，要点②得满分。综上所述，本项指标得 1.00 分。	1.00
		A3.3 绩效 目标 合理 性	1.00	项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目	合理	评价要点：①项目绩效目标是否切实可行；②项目绩效目标是否反映了项目计划的实施成效；③项目绩效目标与实际工作	四项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 25%。	评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标切实可行，要点①得满分；②项目绩效目标设置明确反映了项目计划的实施成效，要点②得满分；③项目绩效目标设置与实际工作内	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				绩效目标与项目实施的相符情况。		内容是否具有相关性；④项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。		容具有相关性，要点③得满分；④项目绩效目标设置明确反映项目预期产出和效果，要点④得满分。综上，本项指标得 1.00 分。	
		A3.4 绩效指标明确性	1.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	三项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 1/3。	评价组通过审阅项目单位提供的项目绩效目标表：①项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、受检对象满意度指标等，要点①得满分；②已填报的绩效指标较为清晰、可衡量，要点②得满分；③项目绩效目标设置与项目目标任务数和计划数相对应，要点③得满分。综上，	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								本项指标得 1.00 分。	
B 过程 (21 分)	B1 资金管理 (7 分)	B1.1 专项债券纳入预算管理规范性	1.00	考察项目资金、项目收益纳入预算管理情况。	规范	评价要点：①专项债券收支、还本付息和专项收入等是否纳入预算管理；②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照规定预算收支科目单独核算、全面管理。	两项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	评价组通过核查项目单位财务资料：①项目专项债券资金收支情况、支付利息等已全部纳入财政预算管理，要点①得满分；②获嘉县检验检测中心收到和使用专项债券资金按照规定预算收支科目单独核算、全面管理，要点②得满分。综上，本项指标得 1.00 分。	1.00
		B1.2 资金使用规范性	3.00	考察专项债券资金使用管理情况，用以反映项目单位对债券	规范	评价要点：①专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②专项债券资	五项都符合得 100% 权重分，有一项不符合扣权重分的 20%。	评价组通过核查项目单位财务资料：①项目专项债券资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，要点①得满分；②项目专项债券资金从拨付到使用有完整的	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				资金的使用是否合规。		金等资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④专项债券资金使用是否用于偿还债务、经常性支出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出；⑤专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情		审批程序和手续，要点②得满分；③项目专项债券资金支出符合项目预算批复和合同规定的用途，要点③得满分；④项目专项债券资金使用均用于本项目支出，未发现用于偿还债务、经常性支出和楼堂管所等中央明令禁止的项目支出，要点④得满分；⑤查阅项目单位财务资料，项目单位依据施工进度、合同约定向县财政局提交资金使用申请，经县财政局审批通过后，由获嘉县财政国库支付中心将对应金额的债券资金拨付至最终收款方，未发现存在截留、挤占、挪用、	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						况。		虚列支出等情况，要点⑤得满分。 综上，本项指标得 3.00 分。	
		B1.3 资金支出进度	2.00	资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量；资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存	100%	评价要点：①资金拨付和支出进度是否按计划执行，是否及时支付到资金使用最末端，形成实物工作量。资金支出进度=（实际支出债券资金/项目实际到位债券资金总额）×100%；②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配，是否存在资金闲	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重分的 50%。	根据项目单位提供的项目资金支出明细：①2022 年 4 月 28 日发行专项债券资金 1,800.00 万元，实际到位 1,800.00 万元，截至评价期结束，该项目已完成竣工审计工作，最终审计结算价为 1,756.644976 万元，项目资金实际支出 1,753.563794 万元，资金支出进度为 99.82%，因剩余资金为十标段质保金，不到支付节点，要点①得满分；②经评价组访谈及查阅相关资料，资金拨付和支出进度与项目	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				在资金闲置情况。		置情况。		建设进度匹配，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
		B1.4 专项债券本息偿还计划执行情况	1.00	专项债券的本息偿还是否和原定计划要求一致，用以反映和考核专项债券本息偿还计划执行情况。	按计划执行	评价要点：专项债券本息是否严格执行本息偿还计划，是否按规定时间、规定金额进行偿还。	若符合得 100% 权重分；不符合，不得分。	评价组通过调研和访谈，获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目专项债券累计发行额 1,800.00 万元，截至评价期，该专项债券已付息 4 次，累计付息 118.44 万元，按照规定时间、规定金额进行偿还。该项目专项债券尚未到还本期限，不涉及债券还本。综上，本项指标得 1.00 分。	1.00
	B2 项目管理	B2.1 项目管理	2.00	项目单位的财务和业务管理制度是	健全	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；	两项都符合得 100% 权重分，有一项不	项目单位提供了相应的财务管理、内部控制管理及公共检验检测中心制度汇编（分页）等相关业务制	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
	(12分)	制度健全性		否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	符合扣权重分的50%。	度，对项目单位的资金管理、资产管理、采购管理、财务审批报账管理和实验室制度及职责等进一步明确规范化，其内容合法、合规、完整，符合评价要点①②。综上，本项指标得2.00分。	
		B2.2 制度执行有效性	2.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	评价要点：①项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目实施是否按照所建立的实施方案得到规范执行。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	根据项目单位提供的资料结合评价组调研结果：①项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，要点①得满分；②根据《获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目实施方案》，该项目计划建设周期为18个月，预计完工时间为2023年	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								9月，而评价组根据相关资料及访谈了解该项目整体于2023年3月初全部实施完成，在实施方案计划周期内实施完成，要点②得满分。综上，本项指标得2.00分。	
		B2.3 政府采购 合规性	2.00	考察采购程序是否符合政府采购相关管理规定，是否严格、规范执行采购程序。	规范	评价要点：①选择的采购方式是否合理，是否符合政府采购管理或部门采购管理相关规定；②采购实施程序是否规范，是否符合政府采购相关流程的规定。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	评价组通过核查采购招标资料：①该项目前期咨询、设计、监理等工作由项目单位自行采购，设备采购及建设施工采取公开招标方式进行，采购活动按照政府采购相关要求选用了合理的采购方式，符合《河南省政府采购管理办法》相关规定，要点①得满分；②项目采购实施程序规范，符合政府采购相关	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								流程，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
		B2.4 合同 执行 有效 性	4.00	考察合同管理是否有效实施，是否按照采购要求订立相关合同，经采购程序后签订的合同是否要素齐全，约定明确，执行有效。	有效	评价要点：①项目所签订合同要素是否齐全，内容明确，表述清晰；②项目所签订的合同是否齐全并及时进行归档；③项目实施过程中是否严格按照签订的相关合同执行。	要点①②各占权重分的20%，要点③占权重分的60%。	经评价组核查：①获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目签订合同中明确双方职责、服务内容、交货时间、质量要求、验收要求等，以及相关约束性条款，但个别合同中有明显错误，如：1标段合同名称填写为“获嘉县公共检验检测中心能力提升项目(九标段)合同”，10标段建设项目监理合同中监理期限填写为“2022.1.1至2022.1.1”，要点①扣10%权重分；②该项目所签订的合同齐全并及	1.20

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								<p>时进行归档，要点②得满分；③项目实施过程中基本按照签订的合同执行，但在合同执行过程中发现存在合同管理不规范、执行不到位等问题，如：一是可行性研究报告咨询服务、项目咨询服务及事前绩效评估报告服务未按合同约定的付款方式付款，可行性研究报告咨询服务合同中约定的付款方式“委托方受托方双方签订合同后3个工作日内，委托方向受托方支付合同额的50%，作为项目的启动费用；在项目通过发改委评审后两个月内委托方将剩余的50%合同额，</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								支付给受托方”，合同签订时间为2021年10月22日，实际于2022年6月6日一次性支付完成；二是项目验收不规范，设备采购合同中验收要求合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人，1-9标段采购合同价均在50万元以上，经评价组查看验收报告，验收组人员共计4人，不符合合同要求。要点③不得分。综上，得30%权重分，本项指标得1.20分。	
		B2.5 项目运营	2.00	考察项目运营管理情况。	规范	评价要点：①项目是否按照行业规定取得运营许可；②项目是	两项都符合得100%权重分，有一项不	①经评价组核查，项目单位具备《检验检测机构资质认定证书》、《农产品质量安全检测机构考核	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		管理规范 性				否建立完善的运营管理制度并严格执行。	符合扣权重的 50%。	合格证书》等相关资质认证，可从事相应检验检测及计量等活动，要点①得满分；②项目单位针对本项目的实施制定了《获嘉县公共检验检测中心能力提升项目运营管理的实施方案》，经现场访谈了解项目单位正在积极完善相关资质申请认定，运营准备工作充分，要点②得满分。综上，本项指标得 2.00 分。	
	B3 资产管理（1分）	B3.1 项目竣工后资产	1.00	项目竣工后是否及时进行了资产备案。	及时	评价要点：①项目竣工后是否及时进行了资产备案；②备案信息是否准确和完整。	两项都符合得 100%权重分，有一项不符合扣权重	经评价组核查，项目竣工后项目单位及时进行了相关仪器设备资产备案，备案信息准确完整，要点①②得满分。综上，本项指标得 1.00	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		产备案					分的 50%。	分。	
	B4 其他管理 (1 分)	B4.1 专项债券项目管理规范性	1.00	专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理系统中录入, 相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开, 用以反映和	规范	评价要点: ①专项债券信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理系统中进行录入和更新; ②是否按照政府信息公开的有关规定和要求, 将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。	两项都符合得 100% 权重分, 有一项不符合扣权重分的 50%。	评价组通过核查项目单位资料: ①项目单位已按照规定将专项债券信息在地方政府债务管理系统中及时完整的进行录入和更新, 要点①得满分; ②评价组通过查询“中国地方政府债券信息公开平台”和“专项债券信息网”等网站, 该项目申请和使用专项债券资金已按照政府信息公开有关规定和要求将专项债券项目有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”进行公开, 要点②得满分。综上, 本项	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				考核信息管理工作开展落实情况。				指标得 1.00 分。	
C 产出 (34 分)	C1 产出数量 (10 分)	C1.1 设备采购完成率	8.00	考察项目的实际采购数与计划采购数的比率,用以反映和考核项目采购数量目标的实现程度。	100%	评价要点: 设备采购完成率=(实际采购设备数/计划采购设备数)×100%。	10 个标段的设备采购全部完成得满分,有一个标段没有完成扣除 1/10 权重分。	评价组通过项目单位资料及现场核查: 10 个采购标段实际采购数量全部按照计划完成,设备采购完成率 100%。根据评分规则,本项指标得 8.00 分。	8.00
		C1.2 实验室改	2.00	考察项目实验室改造工程实际完成	100%	评价要点: 实际完成率=(实际完成面积/计划改造面积)	指标分值=实际完成率×相应权重。	经评价组核查:实验室改造工程已按照计划建设完成,完成率为 100%。根据评分规则,本项指标	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		造工程完成率		面积与计划改造面积的比率，用以反映和考核项目工程改造面积目标的实现程度。		×100%。		得 2.00 分。	
	C2 产出质量 (16 分)	C2.1 设备质量合格率	5.00	考察 10 个标段采购的设备质量合格情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现	100%	评价要点：10 个标段：①设备是否均有出厂合格证、使用说明书等相关出厂证明；②是否委托国家认可的专业检测机构验收并出具验收报	10 个标段①②项都符合得 100%权重分，有一个标段不符合按照 1/10 的权重分分别扣	经评价组现场核查：①10 个标段采购的设备均有出厂合格证、制造商设备使用说明书等相关出厂证明，要点①得满分；②相关设备均经过国家认可的专业检测机构验收并出具检测检定报告，检测结果均合格，设备满足检测要求，可投	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				程度。		告。	除。	入正常使用,要点②得满分。综上,本项指标得 5.00 分。	
		C2.2 设备验收通过率	5.00	考察设备安装完成后的验收通过情况。	100%	评价要点: 设备验收通过率= (完成验收仪器设备数量/实际购置仪器设备数量) ×100%。	达到目标值得满分, 否则,每低于目标值 1%, 扣权重分的 5%, 扣完为止。	根据项目单位提供的验收报告显示, 10 个标段购置的仪器设备全部验收合格, 设备验收通过率为 100.00%。根据评分规则, 本项指标得 5.00 分。	5.00
		C2.3 工程验收合格率	2.00	考察项目实验室改造工程完成后是否及时验收, 是否有验收	100%	评价要点: 项目实验室改造工程是否完成验收并合格。	完成验收且合格得满分, 否则不得分。	经评价组核查, 实验室改造工程已建设完成并验收, 验收结果合格。根据评分规则, 本项指标得 2.00 分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				报告,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。					
		C2.4 设备使用率	2.00	考察公共检验检测中心仪器设备使用情况。	100%	评价要点: 设备使用率=(实际使用仪器设备/实际购置的仪器设备)×100%。	得分=设备使用率×指标分值。	根据查看检验中心的《设备使用记录表》及现场访谈结果,设备采购共10个标段,有6个标段设备已投入使用,开始运营,设备使用率为60%。根据评分规则,本项指标得1.20分。	1.20
		C2.5 设备发生	2.00	考察仪器设备发生故障情况。	≤5次	评价要点: 检验检测中心购置仪器设备发生故障次数。	设备发生故障次数≤5次,得满分;5	评价组通过查看检验检测中心的《设备使用记录表》《设备维修保养记录》及现场访谈结果,仪器设	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		故障次数					次 < 设备发生故障次数 < 10 次得 1 分; 设备发生故障次数 > 10 次, 不得分。	备均为新购进, 截至评价期结束未发生故障。根据评分规则, 本项指标得 2.00 分。	
	C3 产出时效 (4 分)	C3.1 项目完成及时性	4.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实	及时	评价要点: 项目是否按预计完成时间全部建设完成。	项目建设按预计时间完成, 得满分; 晚于预计时间 1 个月内得 2 分; 晚于预计时间 3	经核查获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目预计完工时间为 2023 年 9 月底, 项目实际于 2023 年 3 月已完成设备安装及验收工作, 项目建设完成。根据评分规则, 本项指标得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
				现程度。			个月内得 1 分; 晚于预计时间 3 个月以上不得分。		
	C4 产出成本 (4 分)	C4.1 项目成本节约率	4.00	考察项目预算成本控制情况, 是否存在超支的情况。	≥0%	评价要点: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。其中, 实际成本指项目实施单位如期、保质、保量建成项目实际所耗费的支出; 计划成本指项目实施单位为建成项目计划安排的支	成本节约率 ≥0%得满分, 成本节约率 < 0%时, 每降低 1%, 扣除指标分值 5%, 扣完为止。	根据项目单位签订的涉及项目相关的合同总价为 1,790.467029 万元, 项目建设完成经审计后的终审价为 1,756.644976 万元, 审减金额为 33.822053 万元, 成本节约率=[(1,790.467029-1,756.644976)/1,790.467029]×100%=1.89%。根据评分规则, 本项指标得 4.00 分。	4.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
						出，本项目以所签订的合同总价为准。			
D 效益 (32分)	D1 社会效益 (15分)	D1.1 实验室检测能力提升情况	5.00	考察项目建设完成后，实验室检测能力提升情况。	提升	评价要点：获嘉县公共检测检验中心能力提升项目建设后实验室检测检验项目（参数）较该项目建设前检测水平（参数）增加情况。	产品检验水平（参数）提升 $\geq 35\%$ ，得满分； $30\% \leq$ 产品检验水平（参数）提升 $< 35\%$ 得3分； $25\% \leq$ 农产品检验水平（参数）提升 $< 30\%$ 得1分；产品检验	经评价组核查：根据公共检验检测中心提供的《农产品质量安全检测机构考核合格证书附表》、《检验检测机构资质认定证书附表》，2020年12月9日河南省质量技术监督局批准的食品检测共125项参数，2023年8月14日河南省市场监督管理局批准获嘉县公共检验检测中心检验检测的能力范围（食品）相关检测共264项参数，检测水平有效提升111.20%；2021年3月9日河南省农业农村厅批准	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
							水平提升<25%，不得分。	的农产品检测共 41 项参数，2023 年 10 月 30 日河南省农业农村厅批准获嘉县公共检验检测中心授权检测范围及限制要求相关农产品检测共 124 项参数，检测水平有效提升 202.44%。根据评分规则，本项指标得 5.00 分。	
		D1.2 未发生危害人民群众生命安全	5.00	反映本区域内发生农产品质量安全危害人民群众生命安全的情况。	未发生	评价要点：获嘉县未发生质量不合格农产品流入市场的情况。	未发生质量不合格农产品流入市场情况得满分；发生质量不合格农产品流入市场未	经评价组核查：2023 年 12 月 30 日获嘉县市场监督管理局网站公布《2023 年获嘉县市场监督管理局农产品抽检 3 批次不合格信息公示第十期》、2024 年 04 月 11 日公布《2024 年获嘉县市场监督管理局监督抽检 4 批次不合格信息	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		全事件					威胁人民群众生命安全得3分;发生质量不合格农产品流入市场且威胁人民群众生命安全得0分。	公示第二期》、2024年06月27日公布《2024年获嘉县市场监督管理局抽检5批次不合格信息公示第五期》，以上不合格产品均未危害人民群众生命安全。根据评分规则，本项指标得3.00分。	
		D1.3 检测 工作人员 能力	5.00	考察实验室相关检测工作人员能力提升情况。	提升	评价要点：①是否对相关检测工作人员进行技术培训；②是否取得相关证书。	两项都符合得100%权重分，有一项不符合扣权重分的50%。	经评价组现场查看人员档案记录及访谈了解：①相关检测工作人员均进行了仪器设备技术培训，并取得培训合格证书，要点①得满分；②检测工作人员取得了检验检测	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		提升情况						机构资质认定内审员证, 要点②得满分。综上, 本项指标得 5.00 分。	
	D2 可 持续 影响 (5 分)	D2.1 项目 持续 发挥 作用	5.00	考察项目单位是否建立运行维护长效机制, 延长设施设备使用寿命, 保障公共检验检测中心检测工作正常开展。	建立健全	评价要点: ①项目单位是否建立健全长效机制, 保障日常运行和维护工作; ②正常开展工作情况及对本行业未来可持续发展的影响。	两项都符合得 100% 权重分, 有一项不符合扣权重分的 50%。	经评价组核查: ①项目单位建立有《获嘉县公共检验检测中心能力提升项目运营管理的实施方案》、实验室里设有《液质联用仪器室管理制度》、《医检室检定员职责》、《检测室主任职责》等各项管理制度, 以保障设备使用寿命及实验室日常工作正常运行, 要点①得满分; ②目前, 获嘉县公共检验检测中心成为全市首家通过“双认证”的县级农产品质量安全检测机构, 实现了检验检测机构资质认定	5.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
								(CMA)和农产品质量安全检测机构考核(CATL)的双覆盖,项目实施以来,根据政府及职能部门下达的任务要求,共抽检500批左右产品,涵盖粮油、酒、蔬菜、肥料等多个产品种类,且正在积极申办全部资质工作,在能够有效保障政府及职能部门下达的任务要求的同时,积极拓展市场,增加业务创收,要点②得满分。综上,本项指标得5.00分。	
	D3 满意度 (12)	D3.1 实验室工	5.00	考察获嘉县公共检验检测中心实验	≥95%	评价要点:获嘉县公共检验检测中心实验室工作人员的满意	达到目标值得满分,否则,每低于目	公共检验检测中心实验室工作人员共10名,评价组通过现场调研形式获得满意度有效问卷8份,调	2.64

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
	分)	作人员满意度		室工作人员对该项目建设完成后的满意度。		度，采用实地调研、调查问卷的方式。	标值 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。	查结果显示检验中心实验室工作人员的总体满意度为 85.55%，工作人员满意度得分 = 5 分 - (95% - 85.55%) × 5% × 5 分 = 2.64 分。根据评分规则，本项指标得 2.64 分。	
		D3.2 受检对象满意度	5.00	考察公共检验检测中心受检对象对该项目建设的满意度。	≥90%	评价要点：受检对象的满意度，采用实地调研、调查问卷的方式。	达到目标值得满分，否则，每低于目标值 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。	评价组根据项目特点针对检测中心受检对象设计了满意度调查问卷，通过网络调研形式共计收回有效问卷 30 份，调查结果显示受检对象的总体满意度为 97.29%。根据评分规则，本项指标得 5.00 分。	5.00
		D3.3	2.00	反映获嘉县	≥95%	评价要点：获嘉县产	达到目标值	评价组通过网络调查问卷形式获	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	目标值	指标说明及评分要点	评分规则	评分过程	得分
		获嘉县市场监督管理局满意度		市场监督管理局对公共检验检测中心能力提升建设项目的满意度。		品质量安全监管部门人员的满意度，采用网络调查问卷方式。	得满分，否则，每低于目标值 1%，扣权重分的 5%，扣完为止。	得满意度有效问卷 4 份，调查结果显示获嘉县市场监督管理局工作人员的总体满意度为 100%，根据评分规则。本项指标得 2.00 分。	
合计			100.00						92.04

附件 2：满意度调查问卷

附件 2-1 获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目绩效评价调查问卷(受检对象及市场监督管理局工作人员)

尊敬的先生/女士：

为做好获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目绩效评价工作，为以后类似项目的开展提供参考，我们设计了本调查问卷。本次问卷调查结果仅供研究分析，不做其他用途，请依据您最真实的情况来填写，感谢您的配合！

1.您对检测中心出具检验结果速度的满意度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

2.您对检测中心设备检测水平是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

3.您对检测中心检测结果准确度是否满意？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

4.您对检测中心检测数据可靠性的满意度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

5.您对检测中心工作人员服务态度的满意度？

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

6.您对检测中心工作人员专业技术能力的满意度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

7.您对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的满意度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

8.您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

9.您对获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目还有什么意见或建议:

附件 2-2 获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目绩效评价满意度问卷(工作人员)

尊敬的先生/女士:

您好!为全面了解 2023 年度获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目建设情况,特组织开展本次问卷调查,请您给予宝贵意见。本次问卷调查结果仅供研究分析,不做其他用途,请依据您最真实的情况来填写,感谢您的配合!

1.您认为此次采购的仪器设备是否满足了实际检验工作需要?

A.是 B.否

2.您对采购的仪器的功能(检验工作能力)是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

3.您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备质量是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

4.您在日常工作过程中是否遇到仪器设备发生故障的情况?

A.从未发生故障 B.偶尔发生故障 C.经常发生故障

5.您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备售后服务是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

6.您对获嘉县公共检验检测中心建设完成的及时性是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

7.您认为获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目建设完成后,在提升检验能力方面是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

8.您对于获嘉县公共检验检测中心购置的设备参数匹配性(符合相关标准情况)是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

9.您对于获嘉县检验检测中心质检体系建设及管理情况是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

10.获嘉县区域内今年是否发生过食品危害人民群众生命安全的事件吗?

A.是 B.否

11.您对于获嘉县食品产品质量安全整体状况是否满意?

A.非常满意 B.比较满意 C.一般 D.不太满意 E.非常不满意

12.您对获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目还有什么意见或建议:

附件 3：满意度调查分析报告

一、调研对象及调研内容

（一）调研对象

本次调研对象为获嘉县检验检测中心实验室工作人员、受检对象及获嘉县市场监督管理局工作人员。

（二）调研内容

了解受检对象对获嘉县产品质量安全的满意程度；了解获嘉县检验检测中心实验室工作人员及获嘉县市场监督管理局工作人员对该项目的建设实施及项目实施后产出效果的满意度情况。

二、调研方法与抽样方式

开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。本次问卷调查采用现场调研、网络填写调查问卷等调查方法。

三、问卷的发放和回收


为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止，检测中心实验室工作人员满意度问卷通过现场调研共回收 8 份、受检对象满意度问卷通过网络调研共收回 30 份及获嘉县市场监督管理局工作人员满意度问卷通过网络调研共收回 4 份，有效问卷回收率为 100%。

四、调查问卷分析

(一) 检测中心实验室工作人员

1.您认为此次采购的仪器设备是否满足了实际检验工作需要?

通过此问题，了解实验室工作人员对此次采购的仪器设备是否满足实际检验工作需要情况，调查结果如下：



在回收的 8 份问卷中，8 名实验室工作人员认为此次采购的仪器设备能够满足实际检验工作的需要。


2.您对采购的仪器设备的功能（检验工作能力）是否满意?

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
87.50%	8	5	2	1	0	0
		62.50%	18.75%	6.25%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解实验室工作人员认为该项目实施对采

购的仪器设备的功能（检验工作能力）的整体满意程度，在回收的 8 份问卷中，实验室工作人员认为该项目实施对采购的仪器设备的功能（检验工作能力）的整体满意程度为 87.50%，整体较为满意。其中，表示“非常满意”的占 62.50%，表示“比较满意”的占 25.00%，表示“一般”的占 12.50%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




3.您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备质量是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
84.38%	8	5	2	0	1	0
		62.50%	18.75%	0.00%	3.13%	0.00%


通过此问题，了解实验室工作人员认为该项目实施对检测中心购入的仪器设备质量的整体满意程度，在回收的 8 份

问卷中，实验室工作人员认为该项目实施对检测中心购入的仪器设备质量的整体满意程度为 84.38%，整体较为满意。其中，表示“非常满意”的占 62.50%，表示“比较满意”的占 25.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 12.50%，表示“非常不满意”的占 0.00%。



4.您在日常工作过程中是否遇到仪器设备发生故障的情况？

调查结果如下：

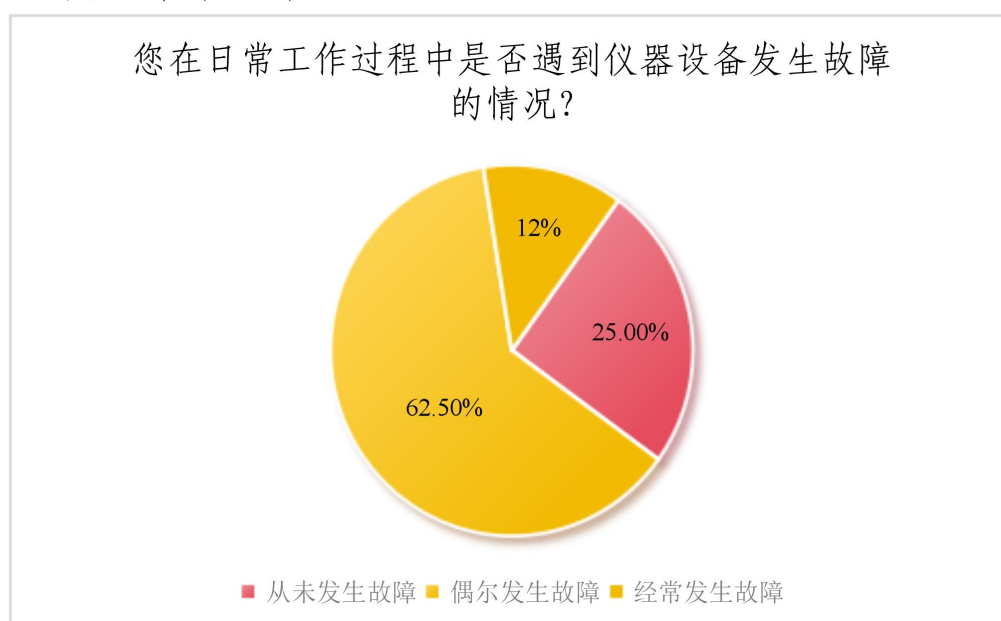


在回收的 8 份问卷中，认为仪器设备从未发生故障的有 2 人，认为仪器设备偶尔发生故障的有 5 人，认为仪器设备经常发生故障的有 1 人。

5.您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备售后服务是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
68.75%	8	2	2	4	0	0
		25.00%	18.75%	25.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解实验室工作人员对检测中心购入的仪器设备售后服务的整体满意程度，在回收的 8 份问卷中，实验室工作人员认为该项目实施对检测中心购入的仪器设备质量的整体满意程度为 68.75%，整体满意程度一般。其中，表示“非常满意”的占 25.00%，表示“比较满意”的占 25.00%，表示“一般”的占 50.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

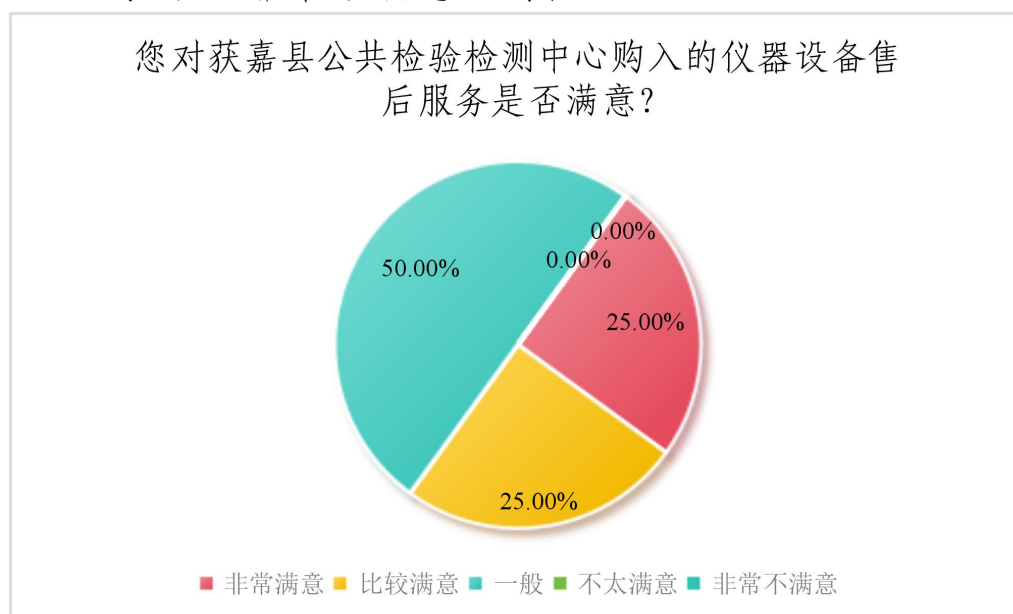


6.您对获嘉县公共检验检测中心建设完成的及时性是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
87.50%	8	6	0	2	0	0
		75.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%

通过此问题,了解实验室工作人员对检测中心项目建设完成及时性的整体满意程度,在回收的8份问卷中,实验室工作人员认为该项目建设完成及时性的整体满意程度为87.50%,整体较为满意。其中,表示“非常满意”的占75.00%,表示“比较满意”的占0.00%,表示“一般”的占25.00%,表示“不太满意”的占0.00%,表示“非常不满意”的占0.00%。




7.您认为获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目建设完成后,在提升检验能力方面是否满意?

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
90.63%	8	5	3	0	0	0
		62.50%	28.13%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解实验室工作人员对该项目实施后，在提升检验能力方面的整体满意程度，在回收的 8 份问卷中，实验室工作人员认为该项目实施后，在提升检验能力方面的整体满意程度为 90.63%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 62.50%，表示“比较满意”的占 37.50%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




8.您对于获嘉县公共检验检测中心购置的设备参数匹配性（符合相关标准情况）是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
90.63%	8	6	1	1	0	0
		75.00%	9.38%	6.25%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解实验室工作人员对检测中心购置的设备参数匹配性（符合相关标准情况）的整体满意程度，在回收的8份问卷中，实验室工作人员认为对检测中心购置的设备参数匹配性（符合相关标准情况）的整体满意程度为90.63%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占75.00%，表示“比较满意”的占12.50%，表示“一般”的占12.50%，表示“不太满意”的占0.00%，表示“非常不满意”的占0.00%。

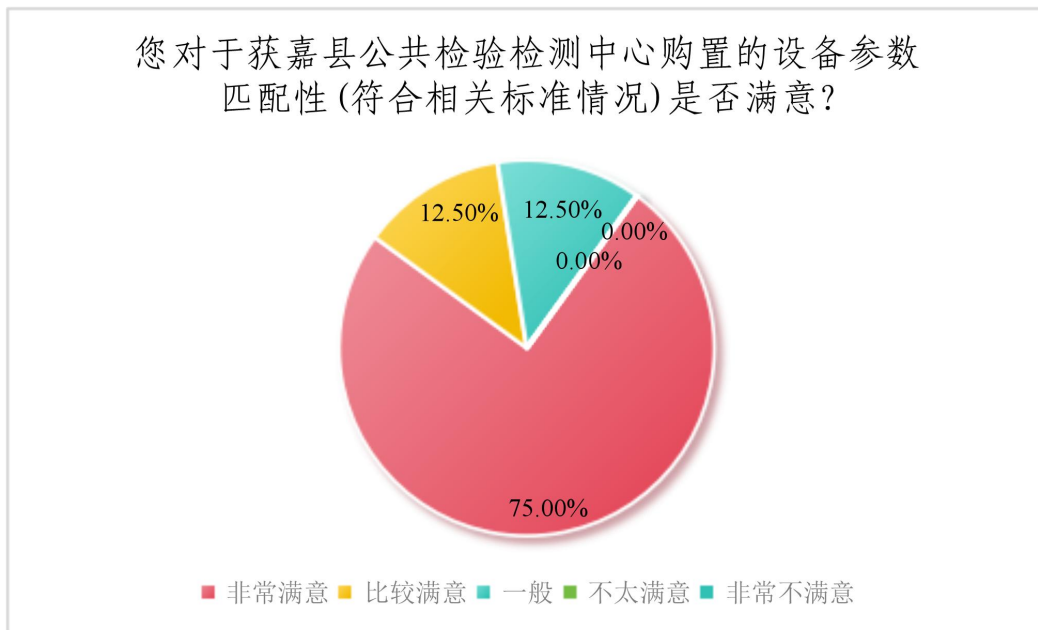


9.您对于获嘉县检验检测中心质检体系建设及管理情况是否满意?

调查结果如下:


综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
87.50%	8	6	0	2	0	0
		75.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解实验室工作人员对检测中心质检体系建设及管理情况的整体满意程度，在回收的8份问卷中，实验室工作人员认为检测中心质检体系建设及管理情况的整体满意程度为87.50%，整体较为满意。其中，表示“非常满意”的占75.00%，表示“比较满意”的占0.00%，表示“一般”的占25.00%，表示“不太满意”的占0.00%，表示“非常不满意”的占0.00%。



10. 获嘉县区域内今年是否发生过食品危害人民群众生命安全的事件吗？

调查结果如下：



在回收的 8 份问卷中，8 名实验室工作人员认为今年未发生过食品危害人民群众生命安全的事件。


11.您对于获嘉县食品产品质量安全整体状况是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
87.50%	8	6	0	2	0	0
		75.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解实验室工作人员对获嘉县食品产品质量安全整体状况的整体满意程度，在回收的 8 份问卷中，实验室工作人员认为获嘉县食品产品质量安全整体状况的整体满意程度为 87.50%，整体较为满意。其中，表示“非常满意”的占 75.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 25.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

您对于获嘉县食品产品质量安全整体状况是否满意?



■ 非常满意 ■ 比较满意 ■ 一般 ■ 不太满意 ■ 非常不满意

根据问卷调查结果显示,检测中心实验室工作人员的整体满意程度为 85.55%。调查对象对问题按照满意评分由高到低排序依次为:您认为获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目建设完成后,在提升检验能力方面是否满意?

(90.63%);您对于获嘉县公共检验检测中心购置的设备参数匹配性(符合相关标准情况)是否满意?(90.63%);您对采购的仪器设备的功能(检验工作能力)是否满意?(87.50%);您对获嘉县公共检验检测中心建设完成的及时性是否满意?(87.50%);您对于获嘉县检验检测中心质检体系建设及管理情况是否满意?(87.50%);您对于获嘉县食品产品质量安全整体状况是否满意?(87.50%);您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备质量是否满意?(84.38%);您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备售后服务是否满意?(68.75%)。

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
1.您认为获嘉县公共检验检测中心能力提升建设项目建设完成后，在提升检验能力方面是否满意？	90.63%	62.50%	28.13%	0.00%	0.00%	0.00%
2.您对于获嘉县公共检验检测中心购置的设备参数匹配性(符合相关标准情况)是否满意？	90.63%	75.00%	9.38%	6.25%	0.00%	0.00%
3.您对采购的仪器设备的功能(检验工作能力)是否满意？	87.50%	62.50%	18.75%	6.25%	0.00%	0.00%
4.您对获嘉县公共检验检测中心建设完成的及时性是否满意？	87.50%	75.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%
5.您对于获嘉县检验检测中心质检体系建设及管理情况是否满意？	87.50%	75.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%
6.您对于获嘉县食品产品质量安全整体状况是否满意？	87.50%	75.00%	0.00%	12.50%	0.00%	0.00%
7.您对获嘉县公共	84.38%	62.50%	18.75%	0.00%	3.13%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
检验检测中心购入的仪器设备质量是否满意?						
8.您对获嘉县公共检验检测中心购入的仪器设备售后服务是否满意?	68.75%	25.00%	18.75%	25.00%	0.00%	0.00%
综合满意度	85.55%					


(二) 受检对象

1. 您对检测中心出具检验结果速度的满意度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题,了解受检对象对检测中心出具检验结果速度的整体满意程度,在回收的30份问卷中,受检对象对检测中心出具检验结果速度的整体满意程度为97.50%,整体满意程度较高。其中,表示“非常满意”的占93.33%,表示“比较满意”的占3.33%,表示“一般”的占3.33%,表示“不太满意”的占0.00%,表示“非常不满意”的占0.00%。




2. 您对检测中心设备检测水平是否满意?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心设备检测水平的整体满意程度，在回收的 30 份问卷中，受检对象对检测中心出具检验结果速度的整体满意程度为 97.50%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 93.33%，表示“比较满意”的占 3.33%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




3.您对检测中心出具检验检测结果准确度是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心出具检验检测结果准确度的整体满意程度，在回收的 30 份问卷中，受检对象对检测中心出具检验检测结果准确度的整体满意程度为 97.50%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 93.33%，表示“比较满意”的占 3.33%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




4.您对检测中心检测数据可靠性的满意度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心检测数据可靠性的整体满意程度，在回收的 30 份问卷中，受检对象对检测

中心检测数据可靠性的整体满意程度为 97.50%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 93.33%，表示“比较满意”的占 3.33%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




5.您对检测中心工作人员服务态度的满意度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心工作人员服务态度的整体满意程度，在回收的 30 份问卷中，受检对象对检测中心工作人员服务态度的整体满意程度为 97.50%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 93.33%，表示“比较满意”的占 3.33%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不

太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




6.您对检测中心工作人员专业技术能力的满意度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心工作人员专业技术能力的整体满意程度，在回收的 30 份问卷中，受检对象对检测中心工作人员专业技术能力的整体满意程度为 97.50%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 93.33%，表示“比较满意”的占 3.33%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




7.您对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的满意度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
97.50%	30	28	1	1	0	0
		93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的整体满意程度，在回收的30份问卷中，受检对象对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的整体满意程度为97.50%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占93.33%，表示“比较满意”的占3.33%，表示“一般”的占3.33%，表示“不太满意”的占0.00%，表示“非常不满意”的占0.00%。

您对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）？

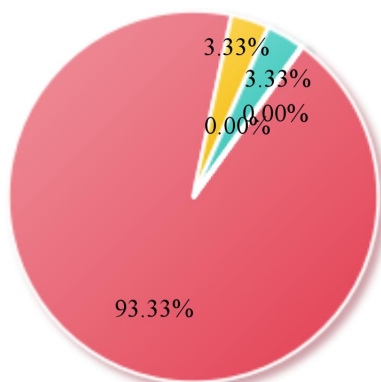

■ 非常满意 ■ 比较满意 ■ 一般 ■ 不太满意 ■ 非常不满意


8.您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
95.83%	30	26	3	1	0	0
		86.67%	7.50%	1.67%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解受检对象对检测中心能力提升项目整体实施情况的整体满意程度，在回收的 30 份问卷中，受检对象对检测中心能力提升项目整体实施情况的整体满意程度为 95.83%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 86.67%，表示“比较满意”的占 10.00%，表示“一般”的占 3.33%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度?



根据问卷调查结果显示，受检对象的整体满意程度为97.29%。调查对象对问题按照满意评分由高到低排序依次为：您对检测中心出具检验结果速度的满意度?（97.50%）；您对检测中心设备检测水平是否满意?（97.50%）；您对检测中心出具检验检测结果准确度是否满意?（97.50%）；您对检测中心检测数据可靠性的满意度?（97.50%）；您对检测中心工作人员服务态度的满意度?（97.50%）；您对检测中心工作人员专业技术能力的满意度?（97.50%）；您对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的满意度?（97.50%）；您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度?（95.83%）。

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
1.您对检测中心出具检验结果速度的满意度?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
2.您对检测中心设备检测水平是否满意?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%
3.您对检测中心出具检验检测结果准确度是否满意?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%
4.您对检测中心检测数据可靠性的满意度?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%
5.您对检测中心工作人员服务态度的满意度?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%
6.您对检测中心工作人员服务态度的满意度?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%
7.您对检测中心检测设备能力(如是否能满足您的检测需求)的满意度?	97.50%	93.33%	2.50%	1.67%	0.00%	0.00%
8.您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度?	95.83%	86.67%	7.50%	1.67%	0.00%	0.00%
综合满意度	97.29%					


(三) 获嘉县市场监督管理局工作人员

1.您对检测中心出具检验结果速度的满意度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心出具检验结果速度的整体满意程度，在回收的4份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心出具检验结果速度的整体满意程度为100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占100.00%，表示“比较满意”的占0.00%，表示“一般”的占0.00%，表示“不太满意”的占0.00%，表示“非常不满意”的占0.00%。




2.您对检测中心设备检测水平是否满意?

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心设备检测水平的整体满意程度，在回收的 4 份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心出具检验结果速度的整体满意程度为 100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 100.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




3.您对检测中心出具检验检测结果准确度是否满意？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心出具检验检测结果准确度的整体满意程度，在回收的4份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心出具检验检测结果准确度的整体满意程度为100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占100.00%，表示“比较满意”的占0.00%，表示“一般”的占0.00%，表示“不太满意”的占0.00%，表示“非常不满意”的占0.00%。




4.您对检测中心检测数据可靠性的满意度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心检测数据可靠性的整体满意程度，在回收的 4 份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心检测数据可靠性的整体满意程度为 100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 100.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。

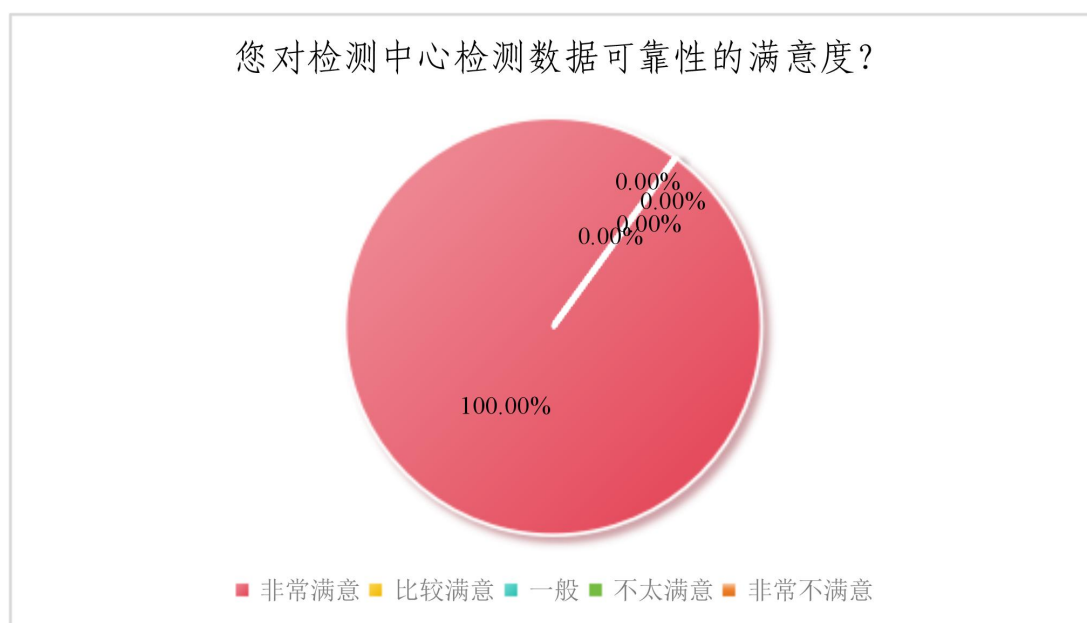


5.您对检测中心工作人员服务态度的满意度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心工作人员服务态度的整体满意程度，在回收的 4 份问卷中，

市场监督管理局工作人员对检测中心工作人员服务态度的整体满意程度为 100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 100.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




6.您对检测中心工作人员专业技术能力的满意度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心工作人员专业技术能力的整体满意程度，在回收的 4 份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心工作人员专业技术能力的整体满意程度为 100.00%，整体满意程度较高。其中，

表示“非常满意”的占 100.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




7.您对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的满意度?

调查结果如下:

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的整体满意程度，在回收的 4 份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的整体满意程度为 100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常

满意”的占 100.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。




8.您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度？

调查结果如下：

综合满意度	合计	100%	75%	50%	25%	0%
		非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
100.00%	4	4	0	0	0	0
		100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

通过此问题，了解市场监督管理局工作人员对检测中心能力提升项目整体实施情况的整体满意程度，在回收的 4 份问卷中，市场监督管理局工作人员对检测中心能力提升项目整体实施情况的整体满意程度为 100.00%，整体满意程度较高。其中，表示“非常满意”的占 100.00%，表示“比较满意”的占 0.00%，表示“一般”的占 0.00%，表示“不太满

意”的占 0.00%，表示“非常不满意”的占 0.00%。



根据问卷调查结果显示，市场监督管理局工作人员的整体满意程度为 100.00%。调查对象对问题按照满意评分由高到低排序依次为：您对检测中心出具检验结果速度的满意度?（100.00%）；您对检测中心设备检测水平是否满意?（100.00%）；您对检测中心出具检验检测结果准确度是否满意?（100.00%）；您对检测中心检测数据可靠性的满意度?（100.00%）；您对检测中心工作人员服务态度的满意度?（100.00%）；您对检测中心工作人员专业技术能力的满意度?（100.00%）；您对检测中心检测设备能力（如是否能满足您的检测需求）的满意度?（100.00%）；您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度?（100.00%）。

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
1.您对检测中心出	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

问题	综合满意度	非常满意	比较满意	一般	不太满意	非常不满意
具检验结果速度的满意度?						
2.您对检测中心设备检测水平是否满意?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3.您对检测中心出具检验检测结果准确度是否满意?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4.您对检测中心检测数据可靠性的满意度?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5.您对检测中心工作人员服务态度的满意度?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6.您对检测中心工作人员服务态度的满意度?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7.您对检测中心检测设备能力(如是否能满足您的检测需求)的满意度?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8.您对检测中心能力提升项目整体实施情况的满意度?	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
综合满意度	100.00%					
